

# 1-1 河川・排水機場などの被災施設の復旧状況（総括）

令和5年10月末時点

令和5年度 第1回 長野市災害復興計画検討委員会 資料2

## ■河川


管理者	河川名	地区	箇所数	進捗状況	備考
国	千曲川	長沼穂保(復旧)	1	完了	決壊箇所の復旧延長140m
		長沼穂保(強化)	1	完了	上記箇所の上下流 420m
		立ヶ花～村山橋(強化)		別紙進捗状況	立ヶ花～村山橋間のうち堤防強化実施済区間を除く区間の堤防強化工事
		篠ノ井塩崎(復旧)	1	完了	軻良根古神社付近
		篠ノ井塩崎(強化)	1	完了	川裏側堤防のり面のコンクリート被覆工事完了
県	浅川外9河川(豊野～篠ノ井)		20	完了	
市	高岡川外1河川(若穂、松代)		3	完了	

## ■排水機場

管理者	施設名	所在地	箇所数	進捗状況	備考
長野平 土地改良区 (市へ管理 委託)	浅川第一排水機場外2機場 (小布施町～長沼)		3	完了	本稼働
市	小森第一排水機場外4機場 (豊野～篠ノ井)		5	完了	本稼働

# 1 - 2千曲川堤防強化（立ヶ花～村山橋）の進捗状況

令和5年10月末時点 2

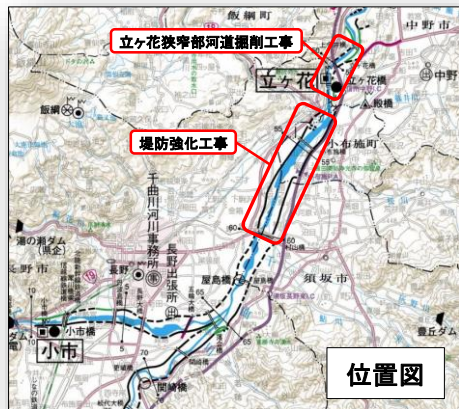


■堤防強化工事(左岸)一覧表

記号	工事名	状況	施工箇所	施工延長
左1	千曲川穂保地区堤防強化工事	完了	川表・川裏	350m・350m
左2	千曲川津野地区堤防強化工事	完了	川表・川裏	320m・320m
左3	千曲川赤沼地区堤防強化工事	完了	川表・川裏	300m・440m
左4	赤沼地区堤防強化工事	完了	川表	700m
左5	飯田地区(左岸)堤防強化工事	完了	川表	1,120m
左6	吉島地区堤防強化その1工事	完了	川表	500m
左7	吉島地区堤防強化その2工事	完了	川表	780m
左8	千曲川大町地区堤防強化工事	工事中	川裏	1,040m
左9	赤沼地区堤防強化その1工事	工事中	川裏	380m
左10	赤沼地区堤防強化その2工事	工事中	川裏	420m
左11	飯田地区(左岸)堤防強化その1工事	工事中	川裏	410m
左12	飯田地区(左岸)堤防強化その2工事	完了	川裏	250m
左13	吉島地区堤防強化その3工事	工事中	川裏	410m
左14	吉島地区堤防強化その4工事	工事中	川裏	430m
左15	吉島地区堤防強化その5工事	工事中	川裏	400m

記号	工事名	状況	施工箇所	施工延長
左16	豊野地区堤防強化その1工事	工事中	川表	230m
左17	豊野地区堤防強化その2工事	工事中	川表	208m
左18	豊野地区堤防強化その3工事	工事中	川表	220m
左19	千曲川村山地区(左岸)堤防強化その1工事	工事中	川表・川裏	480m・560m
左20	千曲川村山地区(左岸)堤防強化その2工事	工事中	川表・川裏	430m・430m
左21	千曲川大町地区堤防強化その1工事	工事中	川表	920m

■ : 工事完了

R5.10末時点

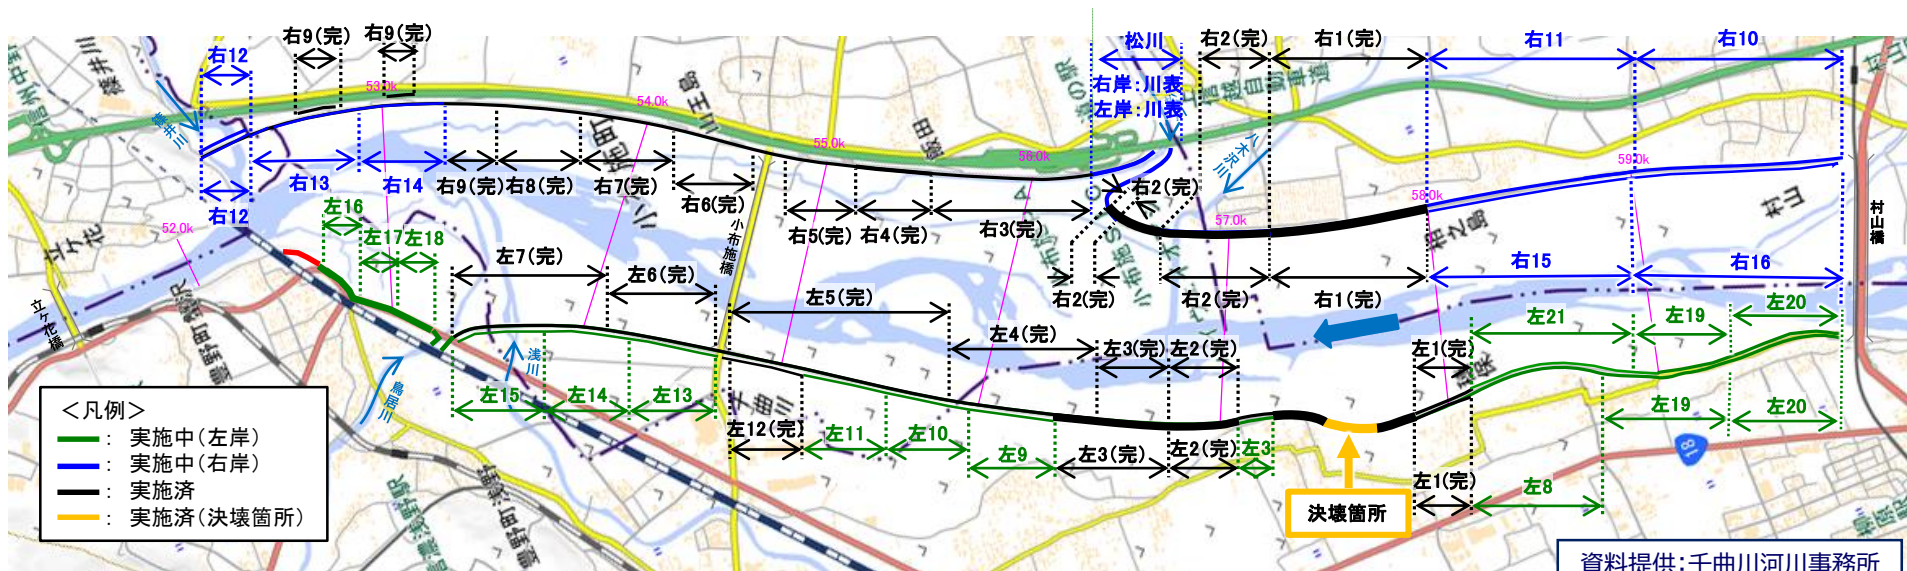



# 1 - 2千曲川堤防強化（立ヶ花～村山橋）の進捗状況

令和5年10月末時点

## <左1>千曲川穂保地区堤防強化工事

【受注者】株式会社 加賀田組  
 【場所】長野県長野市穂保地先  
 【工期】令和3年7月1日  
 ~令和5年1月31日



現在の進捗(令和5年1月末時点)

○1月末に工事が完了しました。



現地施工状況①



現地施工状況②

## <左2>千曲川津野地区堤防強化工事

【受注者】株式会社 浅沼組  
 【場所】長野県長野市津野地先  
 【工期】令和3年7月1日  
 ~令和4年11月30日



現在の進捗(令和4年11月末時点)

○11月末に工事が完了しました。



現地施工状況①



現地施工状況②

## <左3>千曲川赤沼地区堤防強化工事

【受注者】株式会社 植木組  
 【場所】長野県長野市赤沼地先  
 【工期】令和3年7月1日  
 ~令和4年12月23日



現在の進捗(令和4年12月末時点)

○12月末に工事が完了しました。



現地施工状況①



現地施工状況②

## <左4>赤沼地区堤防強化工事

【受注者】中信建設株式会社  
 【場所】長野県長野市赤沼地先  
 【工期】令和3年7月1日  
 ~令和4年8月26日



現在の進捗(令和4年8月末時点)

○8月末に工事が完了しました。



現地施工状況①



現地施工状況②



## <左5> 飯田地区(左岸)堤防強化工事

【受注者】 藤森建設工業株式会社  
 【場所】 長野県上高井郡 小布施町飯田地先  
 【工期】 令和3年7月1日  
 ~令和4年9月9日



現在の進捗(令和4年9月末時点)

○9月に工事が完成しました。



現地施工状況①

現地施工状況②

## <左6> 吉島地区堤防強化その1工事

【受注者】 株式会社 北條組  
 【場所】 長野県上高井郡 小布施町吉島地先  
 【工期】 令和3年7月1日  
 ~令和4年8月31日



現在の進捗(令和4年8月末時点)

○8月末に工事が完成しました。



現地施工状況①

現地施工状況②

## <左7> 吉島地区堤防強化その2工事

【受注者】 株式会社 北條組  
 【場所】 長野県上高井郡 小布施町吉島地先  
 【工期】 令和3年7月1日  
 ~令和4年8月31日



現在の進捗(令和4年8月末時点)

○8月末に工事が完成しました。



現地施工状況①

現地施工状況②

## <左8> 千曲川大町地区堤防強化工事

【受注者】 株式会社 植木組  
 【場所】 長野県長野市大町地先  
 【工期】 令和4年9月21日  
 ~令和6年1月31日



現在の進捗(令和5年10月末時点)

○上流部にて盛土工の施工を行っています。  
 ○盛土工完了部から順次植生工(張芝・核定植)を行っています。



現地施工状況①

現地施工状況②



## <左9> 赤沼地区堤防強化その1工事

【受注者】 藤森建設工業 株式会社  
 【場 所】 長野県長野市  
 大字赤沼地先  
 【工 期】 令和4年9月21日  
 ~令和5年12月28日



現在の進捗(令和5年10月末時点)

○川裏法面において「植生工(張芝)」及び「東屋設置工」を行っています。堤外地高水敷では「工事用道路撤去」を開始しました。

令和5年10月撮影



現地施工状況①



現地施工状況②

## <左10> 赤沼地区堤防強化その2工事

【受注者】 川中島建設 株式会社  
 【場 所】 長野県長野市  
 大字赤沼地先  
 【工 期】 令和4年9月21日  
 ~令和5年12月28日



現在の進捗(令和5年10月末時点)

○張芝の施工が完了し、堤防天端に通信用管路の配管工と、川表側の高水敷に管理用通路の施工を行っています。  
 ○管理用通路が完成した箇所より、工事用道路の敷設板を撤去していく予定です。



現地施工状況①



現地施工状況②

## <左11> 飯田地区(左岸)堤防強化その1工事

【受注者】 川中島建設 株式会社  
 【場 所】 長野県上高井郡  
 小布施町飯田地先  
 【工 期】 令和4年9月21日  
 ~令和5年12月28日



現在の進捗(令和5年10月末時点)

○衣土による覆土作業が完了し、現在は張芝の施工および管理用通路の施工を行っています。



現地施工状況①



現地施工状況②

## <左12> 飯田地区(左岸)堤防強化その2工事

【受注者】 藤森建設工業 株式会社  
 【場 所】 長野県上高井郡  
 小布施町飯田地先  
 【工 期】 令和4年9月21日  
 ~令和5年9月29日



現在の進捗(令和5年9月末時点)

○9月末に工事が完成しました。



現地施工状況①



現地施工状況②



## <左13> 吉島地区堤防強化その3工事

【受注者】 株式会社 北條組  
 【場所】 長野県上高井郡  
 小布施町吉島地先  
 【工期】 令和4年9月21日  
 ~令和5年11月30日



現在の進捗(令和5年10月末時点)  
 ○覆土が完了した箇所に張芝の施工を行っています。



現地施工状況①




現地施工状況②

## <左14> 吉島地区堤防強化その4工事

【受注者】 株式会社 北條組  
 【場所】 長野県上高井郡  
 小布施町吉島地先  
 【工期】 令和4年9月21日  
 ~令和5年11月30日



現在の進捗(令和5年10月末時点)  
 ○坂路の舗装工が完了しました。現在は覆土した法面に張芝を実施しています。

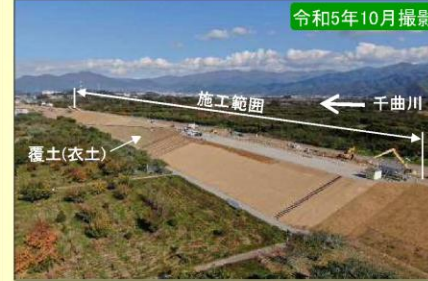

現地施工状況①



現地施工状況②

## <左15> 吉島地区堤防強化その5工事

【受注者】 株式会社 北條組  
 【場所】 長野県上高井郡  
 小布施町吉島地先  
 【工期】 令和4年9月21日  
 ~令和6年3月31日



現在の進捗(令和5年10月末時点)  
 ○川裏側 浅川排水機場から上流区との区境まで河川土工を行っており、今後基礎ブロック工、護岸ブロック工を施工していく予定です。



現地施工状況①



現地施工状況②

## <左16> 豊野地区堤防強化その1工事

【受注者】 中信建設 株式会社  
 【場所】 長野県長野市豊野地先  
 【工期】 令和5年7月1日  
 ~令和6年3月25日



現在の進捗(令和5年10月末時点)  
 ○準備工としての現地測量及び施工計画の立案が完了しました。  
 ○今後、工事用道路の築造から施工していきます。



現地施工状況①



現地施工状況②



## <左17> 豊野地区堤防強化その2工事

【受注者】 中野土建 株式会社  
 【場所】 長野県長野市豊野地先  
 【工期】 令和5年4月1日  
 ~令和5年12月26日



現在の進捗(令和5年10月末時点)

○法覆護岸工における大型ブロック張の施工を進めています。



現地施工状況①



現地施工状況②

## <左18> 豊野地区堤防強化その3工事

【受注者】 中野土建 株式会社  
 【場所】 長野県長野市豊野地先  
 【工期】 令和5年4月1日  
 ~令和6年1月10日



現在の進捗(令和5年10月末時点)

○法覆護岸工の施工を進めています。



現地施工状況



## <左19> 千曲川村山地区(左岸)堤防強化その1工事

【受注者】 株式会社 加賀田組  
 【場所】 長野県長野市村山地先  
 【工期】 令和5年4月1日  
 ~令和6年1月12日



現在の進捗(令和5年10月末時点)

○護岸基礎及び法面の整形を行っています。  
 ○護岸基礎の床掘後、クレーンにより基礎ブロックを設置しています。



現地施工状況①



現地施工状況②

## <左20> 千曲川村山地区(左岸)堤防強化その2工事

【受注者】 株式会社 植木組  
 【場所】 長野県長野市村山地先  
 【工期】 令和5年4月1日  
 ~令和6年1月12日



現在の進捗(令和5年10月末時点)

○護岸基礎設置箇所の床掘り及び基礎設置を行っています。



現地施工状況①



現地施工状況②

## <左21> 千曲川大町地区堤防強化その1工事

【受注者】 大日本土木 株式会社  
 【場所】 長野県長野市大町地先  
 【工期】 令和5年3月28日  
 ~令和6年2月7日



現在の進捗(令和5年10月末時点)

○護岸基礎工(基礎ブロック)、護岸工(大型ブロック張)の作業を行っています。




現地施工状況①



現地施工状況②

## ●堤防強化の基本構造

【横断模式図】

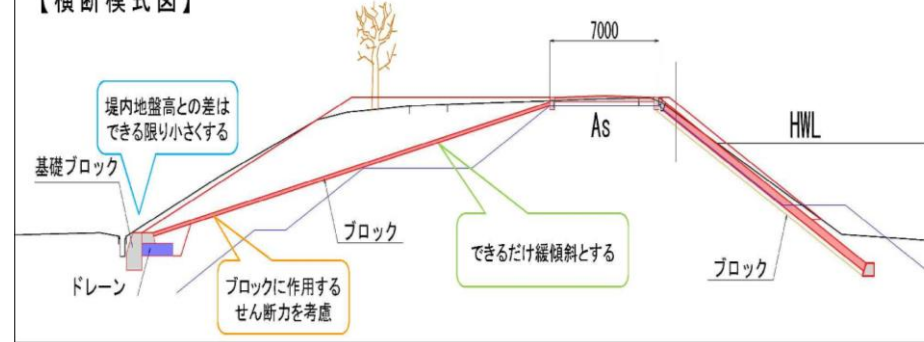



○信濃川水系緊急治水対策プロジェクトでは、令和9年度まで河道掘削(立ヶ花狭窄部)を実施する予定

## <緊急治水対策プロジェクト目標>


### 【R9年度末まで】

令和元年東日本台風における、千曲川本川からの越水等による家屋部の浸水を防止。

## 立ヶ花狭窄部



## 上下流バランスを考慮した施工ステップ

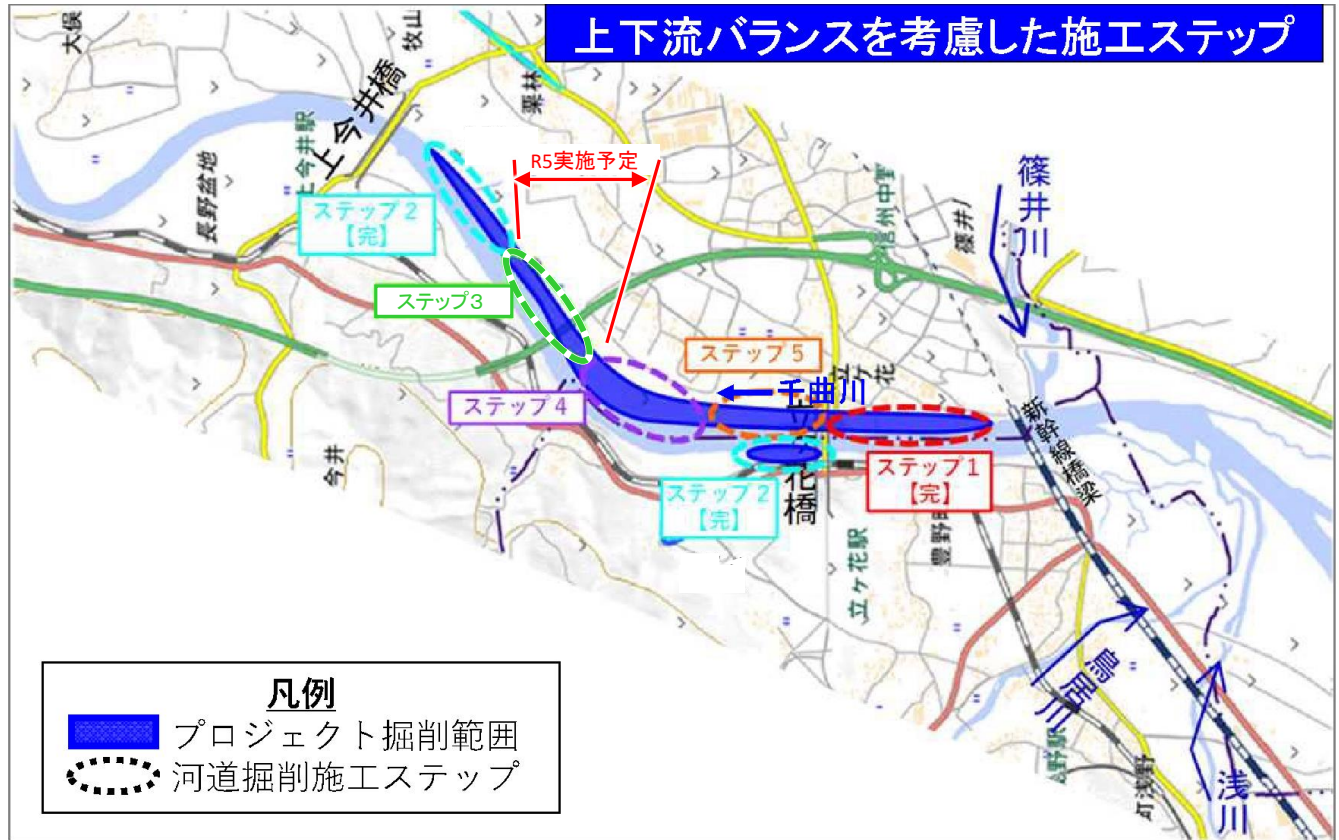

## 立ヶ花地区河道掘削工事

【受注者】(株)フクザワ  
コーポレーション  
【場所】長野県中野市立ヶ花地先  
【工期】令和3年6月1日  
～令和4年3月24日



ステップ1完成

現在の進捗(令和4年3月末時点)  
○令和4年3月に工事完了しました。



現地施工状況①



現地施工状況②



着手前



完成後

## 立ヶ花狭窄部河道掘削その1工事

【受注者】(株)鹿熊組  
【場所】長野県長野市豊野町蟹沢地先  
中野市上今井地先  
【工期】令和4年5月27日  
～令和5年3月20日



ステップ2完成

現在の進捗(令和5年3月末時点)  
○令和5年3月に工事完了しました。



着手前



完成後



着手前



完成後



- 令和元年東日本台風に対する治水対策として、直轄管理区間において、5箇所の遊水地整備を予定。
- 令和9年度までの遊水地整備の完成(令和7年度からの暫定運用開始)を目指します。



・国が整備を進めている中野市の上今井遊水地と千曲市の埴生遊水地の起工式を5月に開催し、現在は工事施工中。  
・塩崎遊水地においては、9月に用地に係る地権者説明会を開催、冬頃より用地交渉を進めていく計画。



- 浅川排水機場の増設として、県の施工による「(仮称) 浅川 第四排水機場」の整備が令和6年度末に完成予定。
- 毎秒7m<sup>3</sup>の排水ポンプ工事を実施中。







- ① 長沼雨水調整池整備 (令和8年度完成予定)
- ② 仁右エ門水門の自動化 (完成)
- ③ 復興道路に併せて雨水幹線整備
- ④ 防災ステーション周辺に雨水貯留施設
