

## 簡易水道統合事業の進捗状況について

簡易水道は、事業規模が小さいことから一般的に経営基盤が脆弱であるため、地域住民に対するサービス水準の維持向上を図る観点から、地域の実情に応じ、事業の統合・広域化による効率的な経営体制の確立を図っていくことが喫緊の課題となっています。

そこで、厚生労働省では簡易水道事業の統合を促進する目的で、簡易水道事業を平成28年度末までに上水道事業へ統合する「簡易水道事業統合計画」を策定した場合、簡易水道の整備に対して国庫補助を受けられる制度を創設しました。(補助率 1/4)

長野市においても、「簡易水道事業統合計画書」を策定し、国庫補助制度を活用し事業を実施しています。

### 1 事業の概要

- (1) 計画期間 平成22年度～28年度（7年間）
- (2) 総事業費 4,292,320 千円（補助対象額 2,090,894 千円）
- (3) 主な事業内容

#### ① 施設の統廃合

- ・水量、水質に課題のある水源や老朽化した浄水場の統廃合  
 水源 56箇所⇒46箇所 浄水場 9箇所⇒4箇所

#### ② 遠隔監視システムを上水道に一体化

- ・遠隔監視システムの整備 77箇所

#### ③ 老朽化した施設や管路の整備

- ・ポンプ施設の更新や漏水の著しい老朽配水管の布設替

事業名	計画 給水人口	事業費	事業スケジュール						進捗率		
			内容	22	23	24	25	26		27	28
戸隠簡易水道	4,294 人	1,603,845 千円	①								93.8 %
			②								
			③								
鬼無里簡易水道	1,368 人	688,948 千円	②								72.9 %
			③								
			①								
大岡簡易水道	1,392 人	329,300 千円	②								81.9 %
			③								
			①								
信州新町簡易水道	4,590 人	891,428 千円	②								77.2 %
			③								
			①								
中条簡易水道	2,370 人	778,799 千円	①								56.2 %
			②								
			③								
全体	14,014 人	4,292,320 千円								79.2 %	


(進捗率は平成27年度末見込)

### 2 今後の予定

事業統合に向けたスケジュールは、以下のとおりです。

- ・平成28年6月議会 4地区の簡易水道事業の経営事業認可の変更のため、「水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例」を改正
- ・平成28年12月議会 事業統合のため、「水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例」を改正
- ・平成29年3月まで 事業統合のため、上水道事業の経営事業認可の変更を厚生労働省へ申請

長野市 水道事業区分図

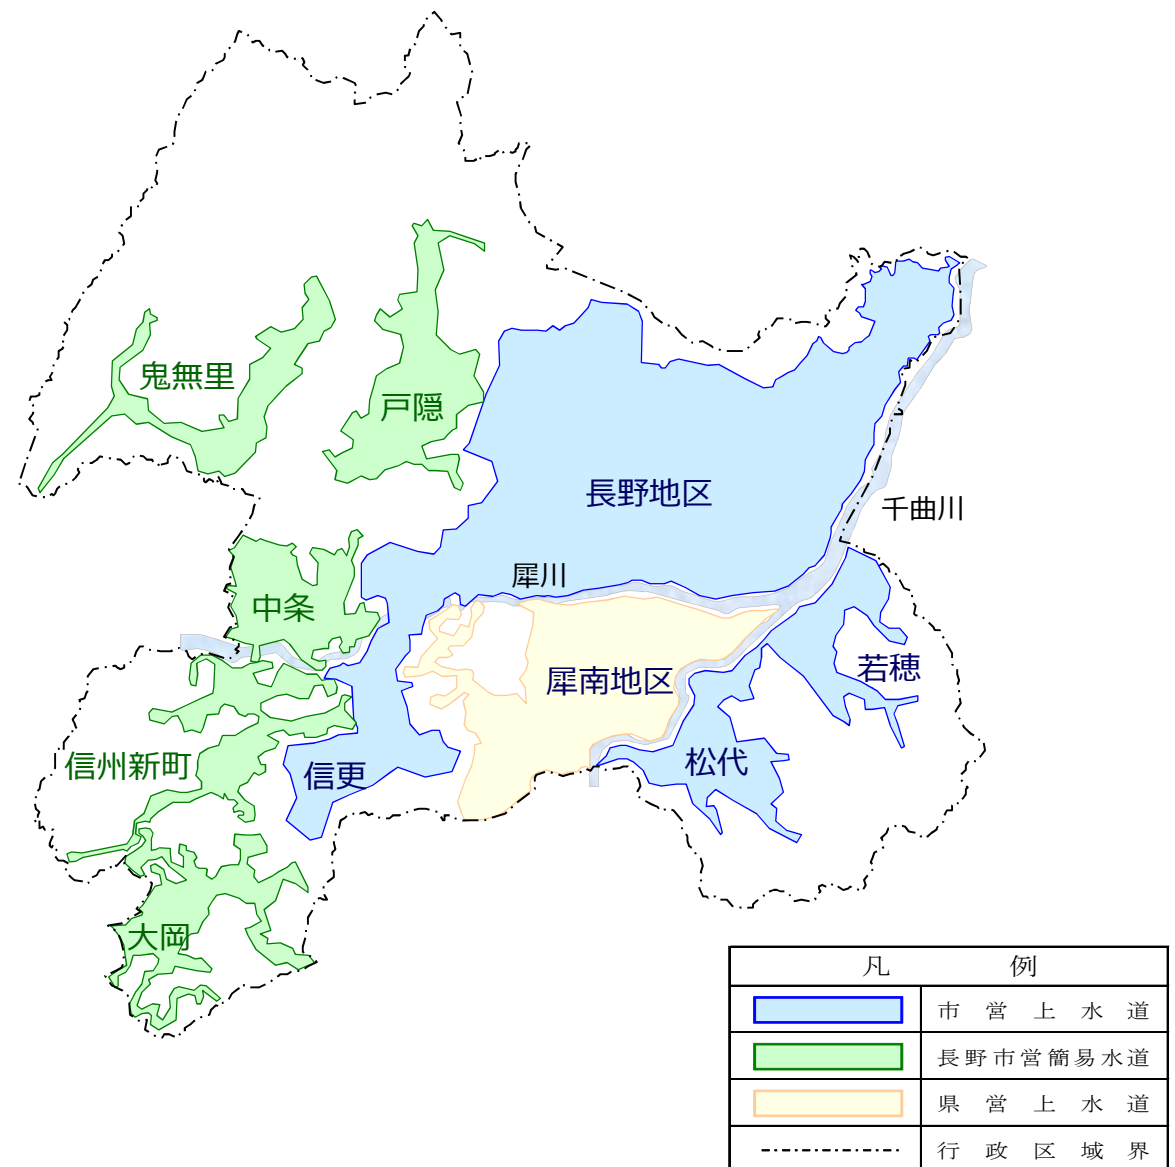




# 戸隠・鬼無里簡易水道事業

## 戸隠簡易水道

## 鬼無里簡易水道

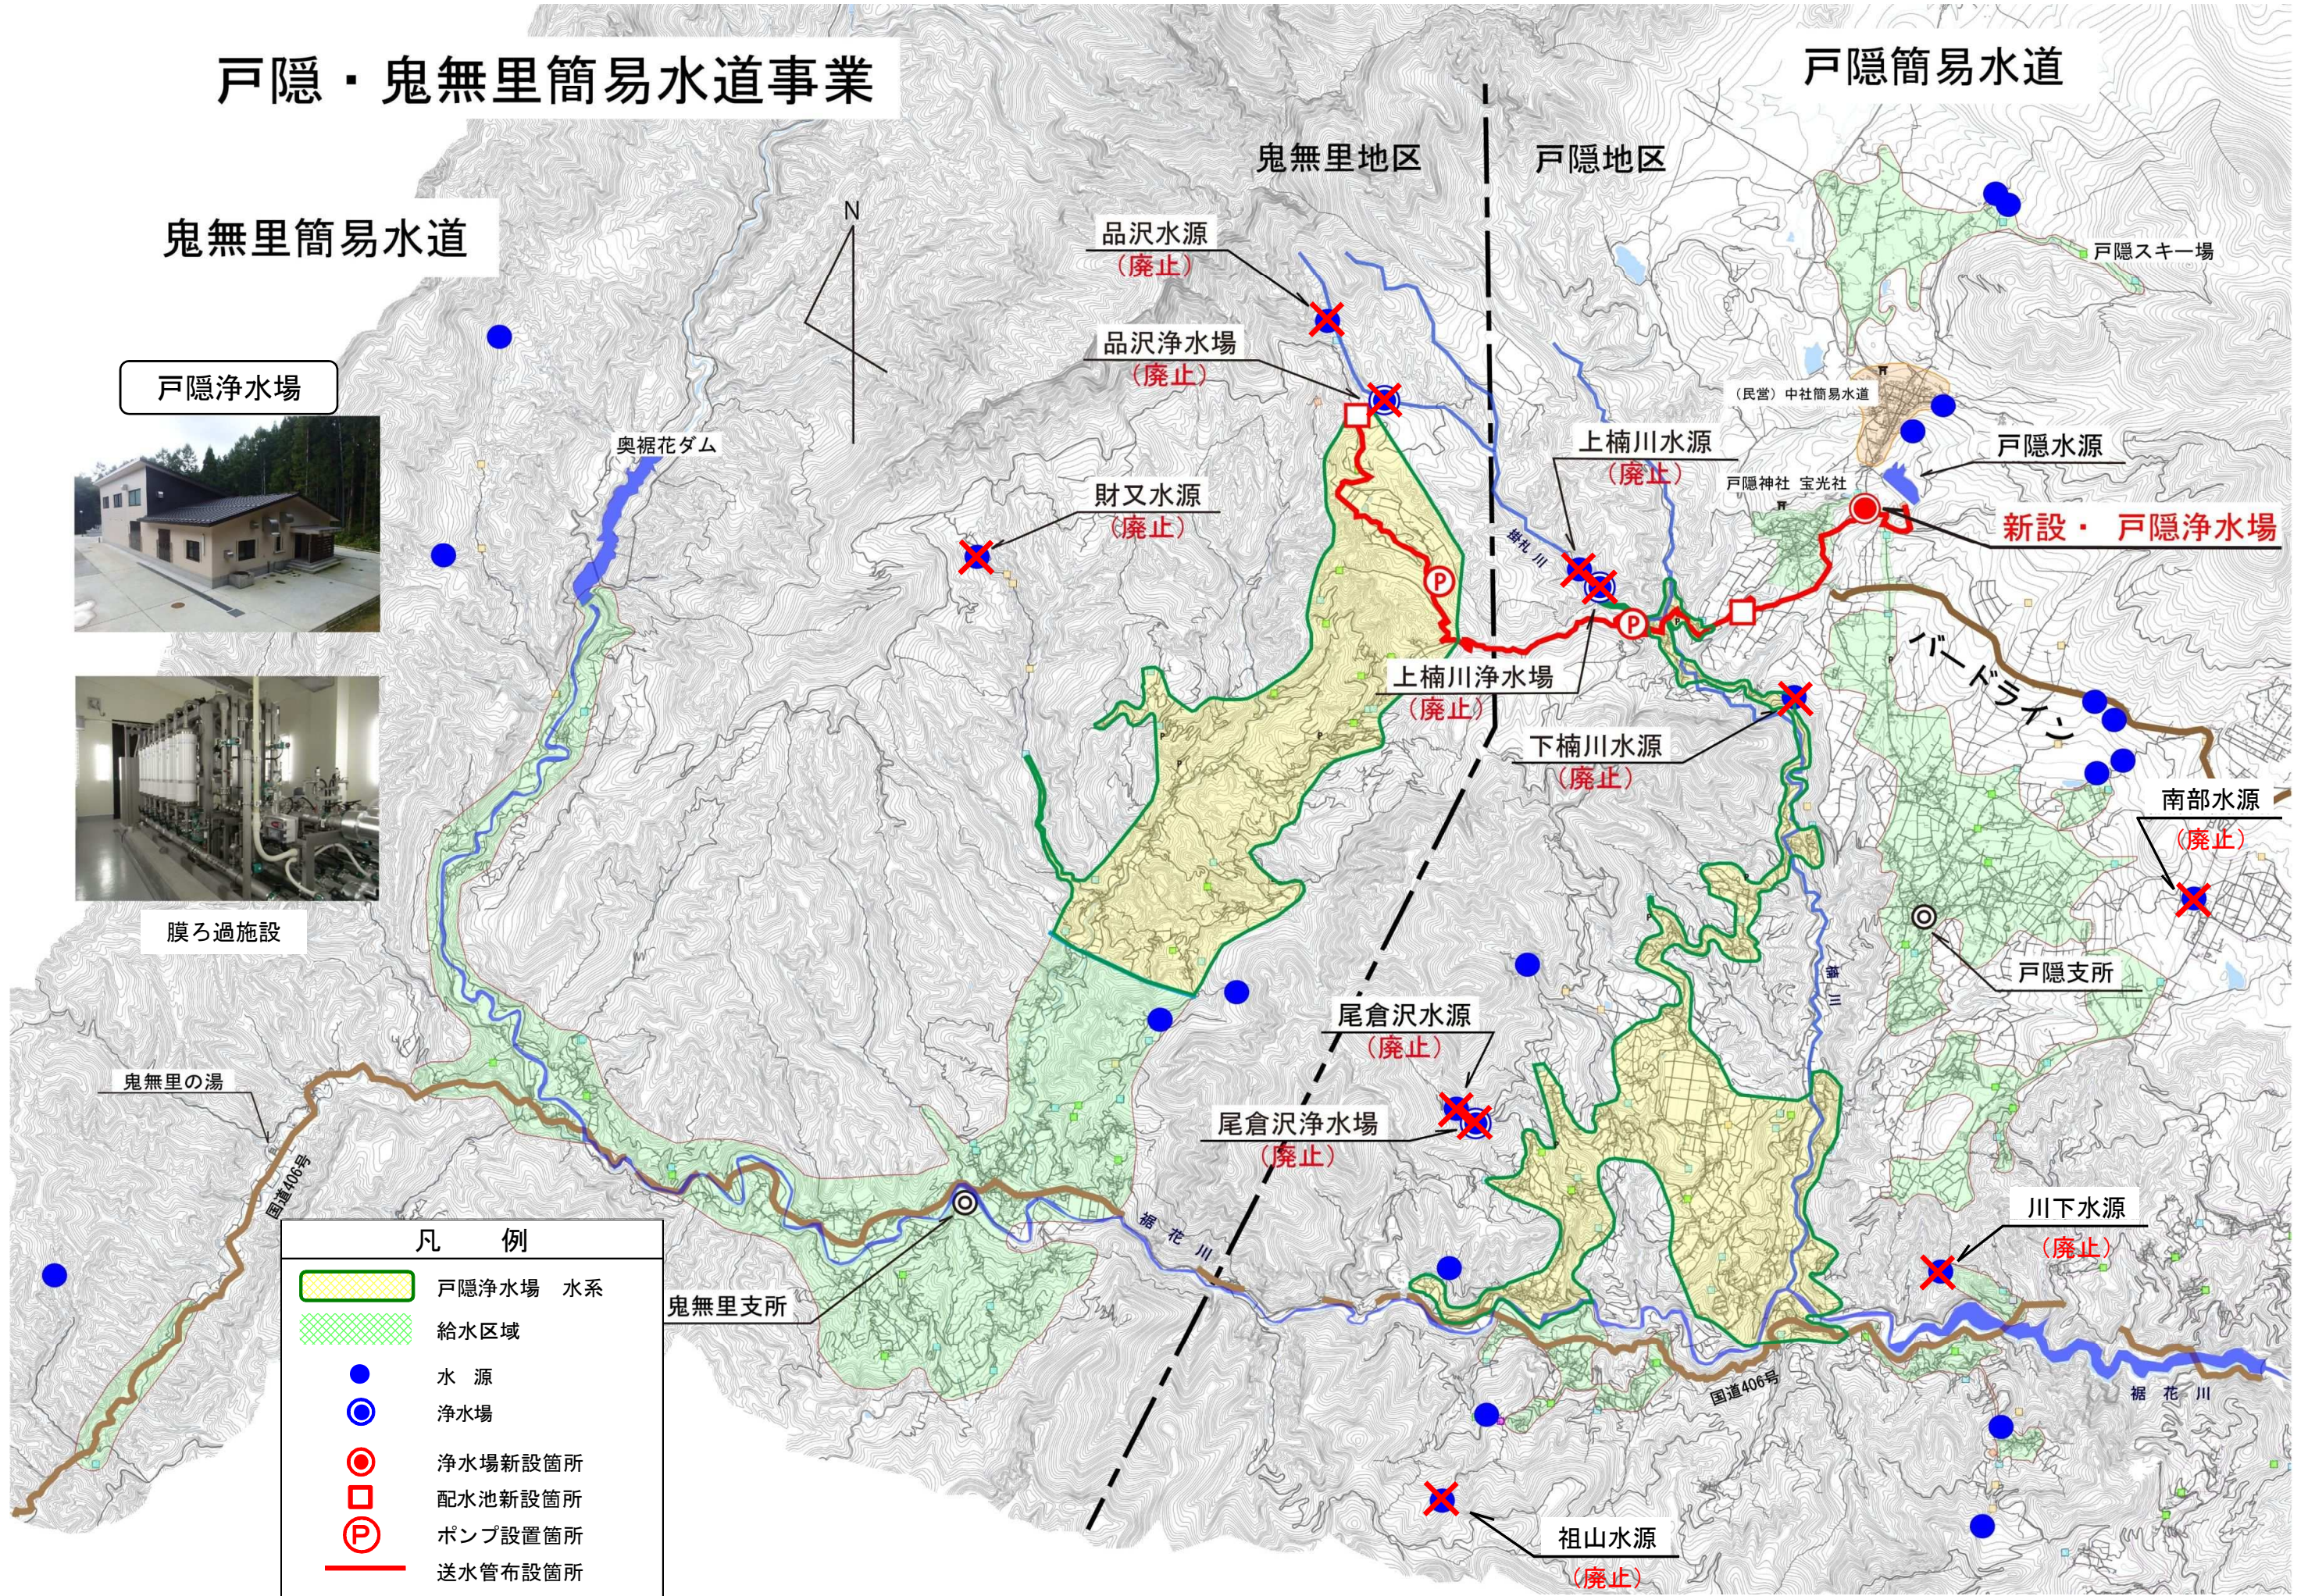

凡 例	
	戸隠浄水場 水系
	給水区域
	水 源
	浄水場
	浄水場新設箇所
	配水池新設箇所
	ポンプ設置箇所
	送水管布設箇所



# 中条簡易水道事業

清水水源

(膜ろ過施設設置) △

本郷水源

(廃止) ✕


本郷浄水場




三ヶ野浄水場



沈殿池 外壁  
経年劣化による老朽化

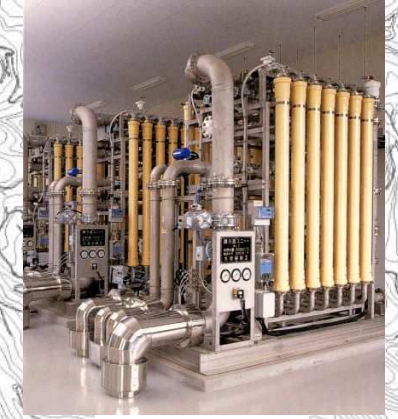

膜ろ過施設

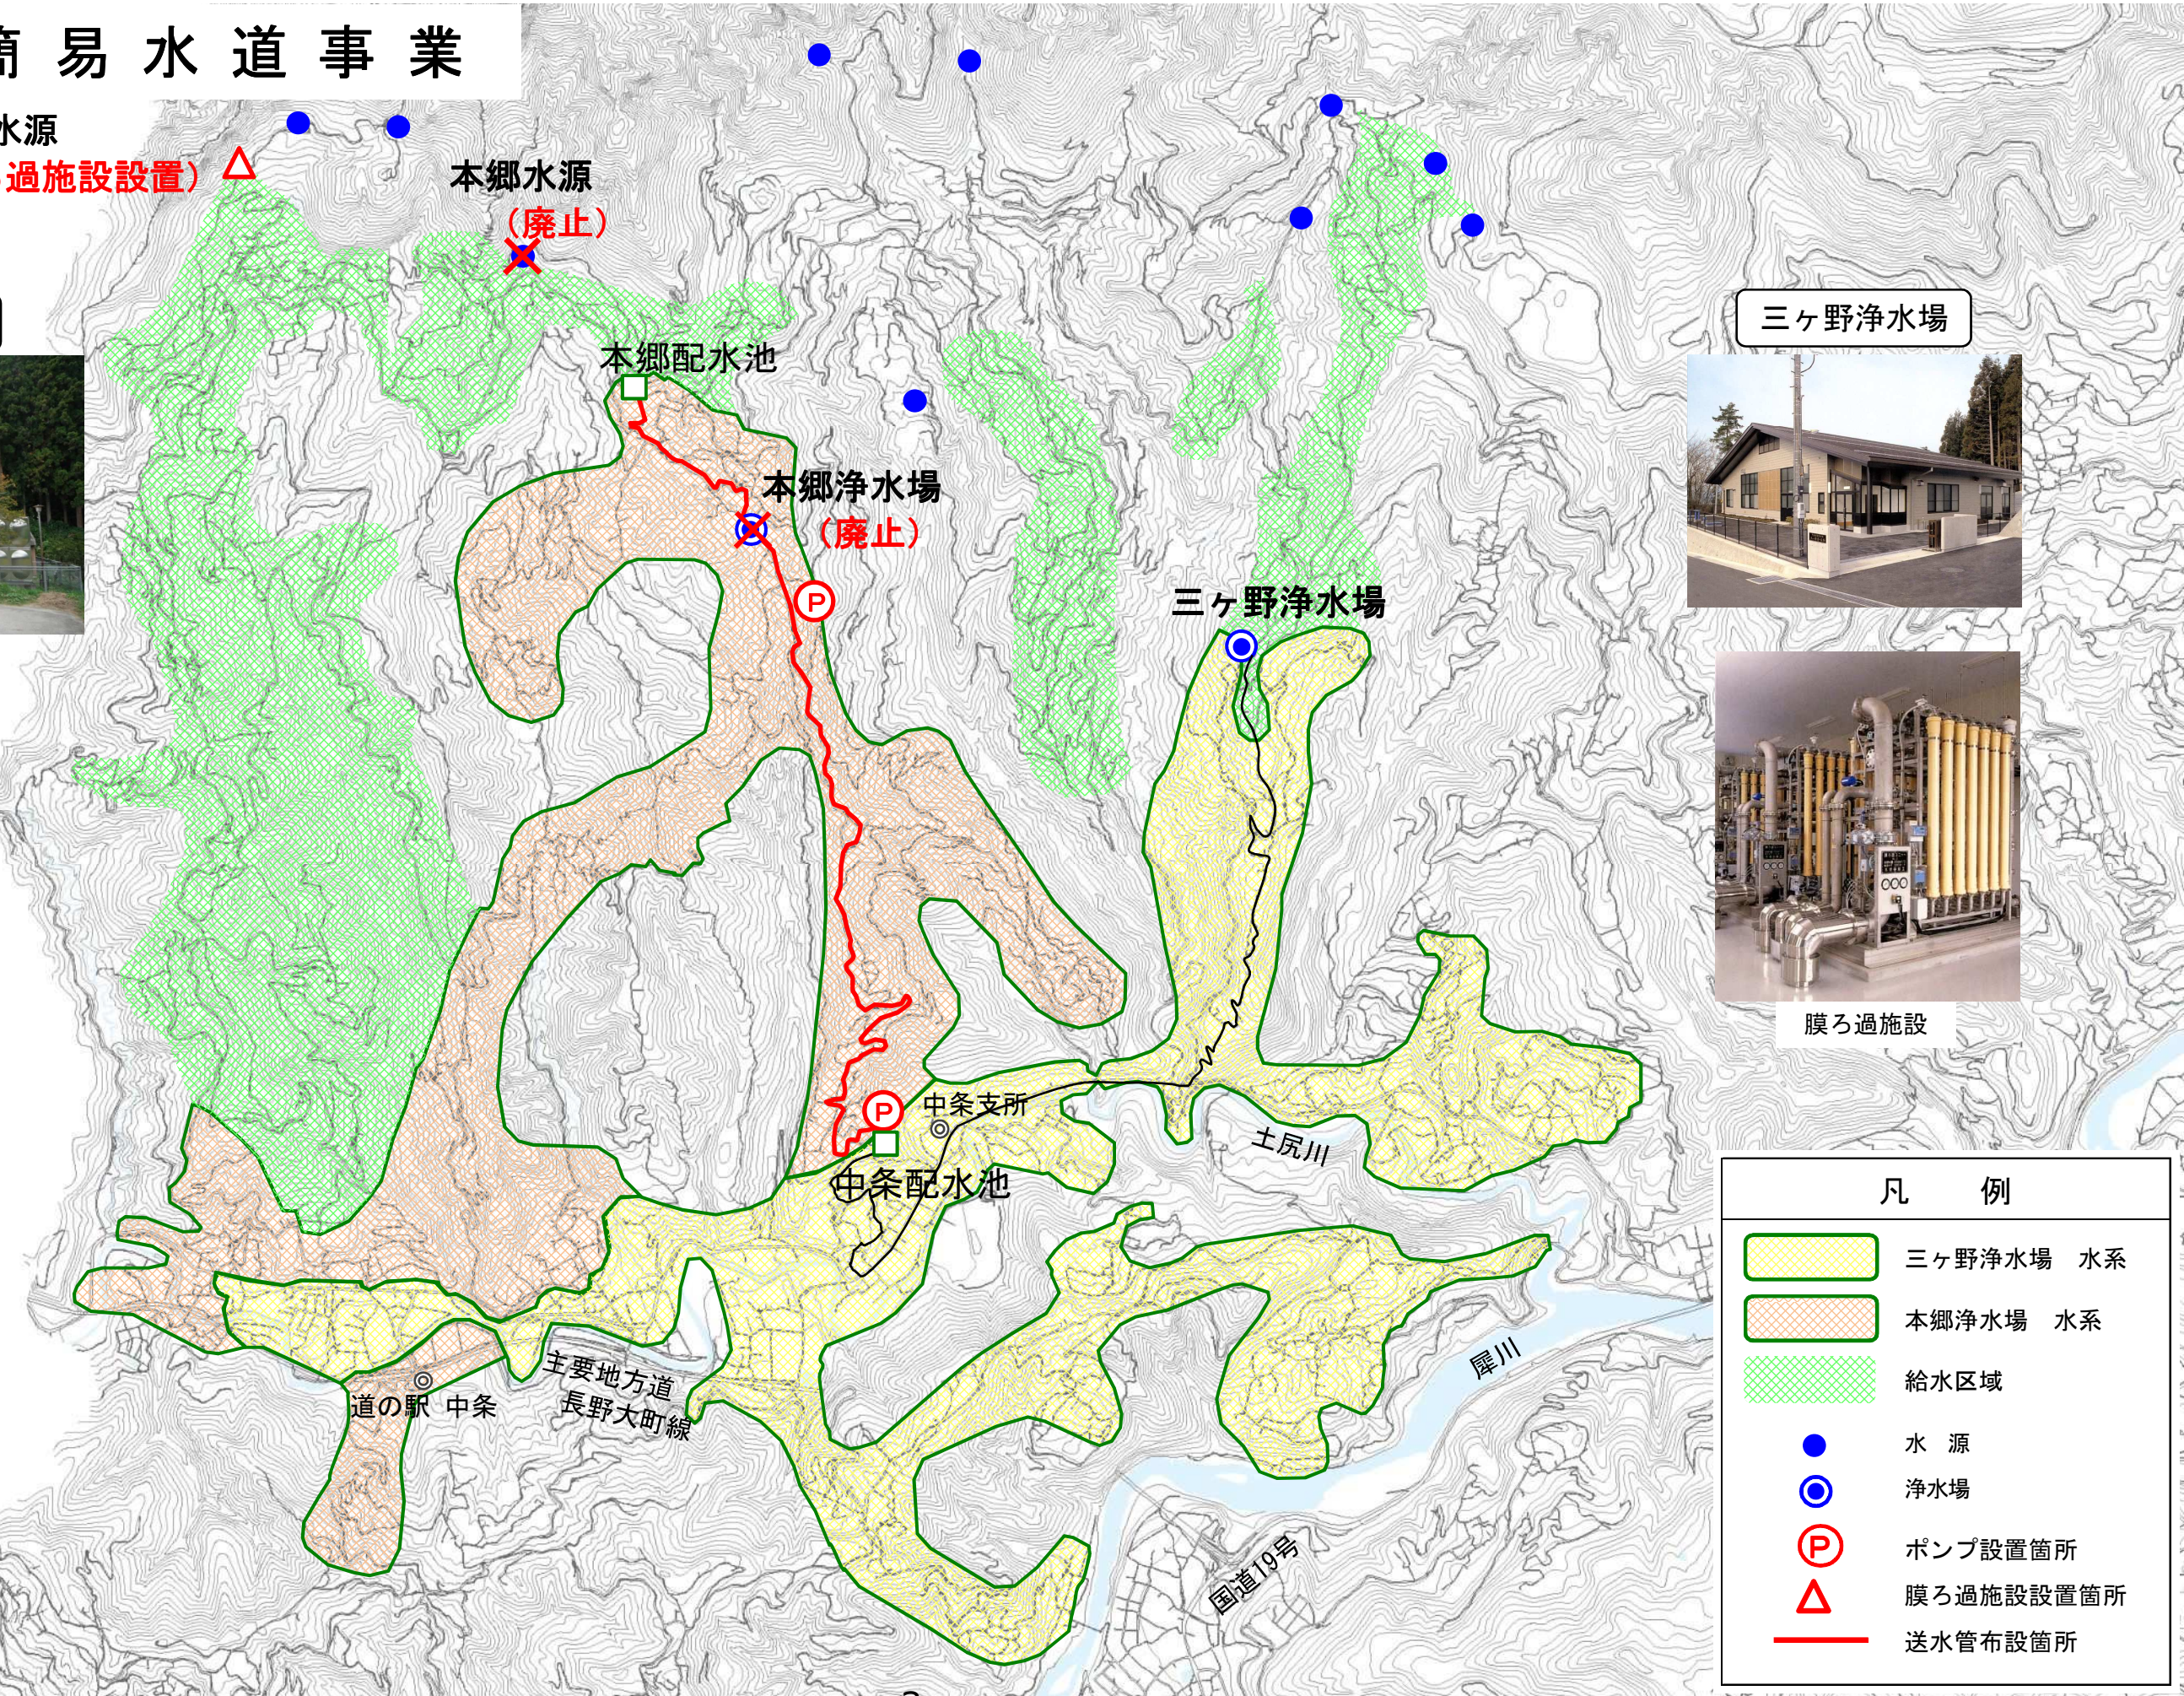

## 凡 例

- 三ヶ野浄水場 水系
- 本郷浄水場 水系
- 給水区域
- 水 源
- 浄水場
- ポンプ設置箇所
- 膜ろ過施設設置箇所
- 送水管布設箇所
