

長野市公共施設個別施設計画 ～温泉保養・宿泊施設編～

【令和3年度(2021年度)～令和12年度(2030年度)】

将来世代に負担を先送りすることなく、
より良い資産を次世代に引き継いでいく

公共施設マネジメントの基本理念

令和3年(2021年)2月

長野市

目次

1 公共施設マネジメントの推進	1
(1)個別施設計画とは.....	1
(2)計画の目的等.....	2
(3)本市の現状と課題.....	2
2 対象施設	5
(1)対策等を示す施設.....	5
(2)施設の配置.....	7
3 計画期間	7
4 施設の現状と課題	8
(1)設置目的.....	8
(2)根拠法令等.....	8
(3)老朽化の状況.....	8
(4)利用状況.....	9
(5)維持管理コストの状況.....	9
(6)今後の改修・更新費用の推計.....	10
(7)これまでの施設配置や規模の基準等.....	11
(8)課題.....	11
5 施設評価(対策の優先順位の考え方)	12
(1)一次検討(定量的な分析).....	13
ア 建物の状態(劣化度).....	13
イ 利用状況.....	13
ウ 維持管理等コストの状況.....	13
(2)二次検討(定性的な要素).....	15
ア サービスの必要性、代替性.....	15
イ 施設配置状況等.....	15
ウ 運営の改善等.....	15
エ ワークショップ・地元意見等.....	15
オ 対策による影響・効果.....	15
(3)二次検討の結果.....	16
ア サービスの必要性、代替性.....	16
イ 施設配置状況等.....	16
ウ 運営の改善等.....	16
エ ワークショップ・地元意見等.....	16
オ 対策による影響・効果.....	17
6 個別施設の方針	18
(1)機能の方向性.....	18
(2)建物の対策.....	18

(3)実施時期	21
(4)個別施設の方針(10年間の対策等)	22
7 個別施設の対策等に係る費用	24
(1)概算費用	24
(2)対策の効果	24
8 公共施設マネジメントの更なる推進に向けて	26
<資料>	27

個別施設計画(建築物)の策定単位

大分類	中分類 = 策定単位 <small>黒線囲み: 本計画の該当施設、(済1~4): 令和元年度までに策定済の計画</small>
学校教育施設	(1)学校施設(小学校、中学校、高等学校、学校給食センター)、 (2)その他施設(学校教育)
生涯学習・文化施設	(3)公民館・交流センター、(4)集会所、(5)市民文化・コンベンション施設、 (6)図書館、(7)博物館、(8)隣保館、(9)その他施設(生涯学習・文化)
観光・レジャー施設	(10)温泉保養・宿泊施設 (11)スキー場、キャンプ場、 (12)その他施設(観光・レジャー)
産業振興施設	(13)産業振興施設
体育施設	(14)体育館・屋内運動場、(15)運動場等付帯施設、(16)大規模運動施設等、 <u>(済1)市民プール</u> 、(17)その他施設(体育)
保健福祉施設	(18)老人憩の家、(19)高齢者福祉施設、(20)障害福祉施設、(21)保健センター、 (22)保育所・認定こども園、(23)児童館・児童センター、(24)その他子育て支援施設 <u>(済2)戸隠企業福祉センター</u> 、(25)その他施設(保健福祉)
医療施設	(26)病院・診療所
行政施設	(27)本庁舎、(28)支所、(29)消防庁舎、(30)消防団詰所、(31)教職員・職員住宅、 <u>(済3)公文書館</u> 、(32)その他施設(行政)
公営住宅	<u>(済4)市営住宅等</u> 、(33)その他施設(公営住宅)
その他施設	(34)駐車場、(35)交通施設、(36)その他施設(その他)

1 公共施設マネジメントの推進

(1)個別施設計画とは


本市は、持続可能な行財政運営に基づき、元気あるまちづくりや市民生活の質の向上を目指し、将来にわたり真に必要な公共施設サービスを提供するため、平成 29 年 3 月、長野市公共施設等総合管理計画(以下「総合管理計画」という。)を策定し、「将来世代に負担を先送りすることなく、より良い資産を次世代に引き継いでいく」を基本理念として全庁的な公共施設マネジメントを推進しています。

建築物の長野市公共施設個別施設計画(以下「本計画」という。)は、総合管理計画に基づき、個別施設ごとの具体的な対応方針を定める計画として、点検・診断によって得られた個別施設の状態、維持管理・更新等に係る対策の優先順位の考え方、対策の内容や実施時期を示すもので、国のインフラ長寿命化基本計画(平成 25 年 11 月インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議策定)における「個別施設毎の長寿命化計画(個別施設計画)」として策定するものです。

なお、本計画は、総合管理計画における施設分類の「中分類」を基本とする編ごとに策定します。

本計画の策定に当たっては、品質(良好な施設、環境)・供給(真に必要なサービス)・財務(長期にわたる最少の経費)の3つの視点から公共施設の現状を客観的に把握・分析するとともに、エリアマネジメントやまちづくりの視点等も踏まえて検討します。

【個別施設計画の位置付け】

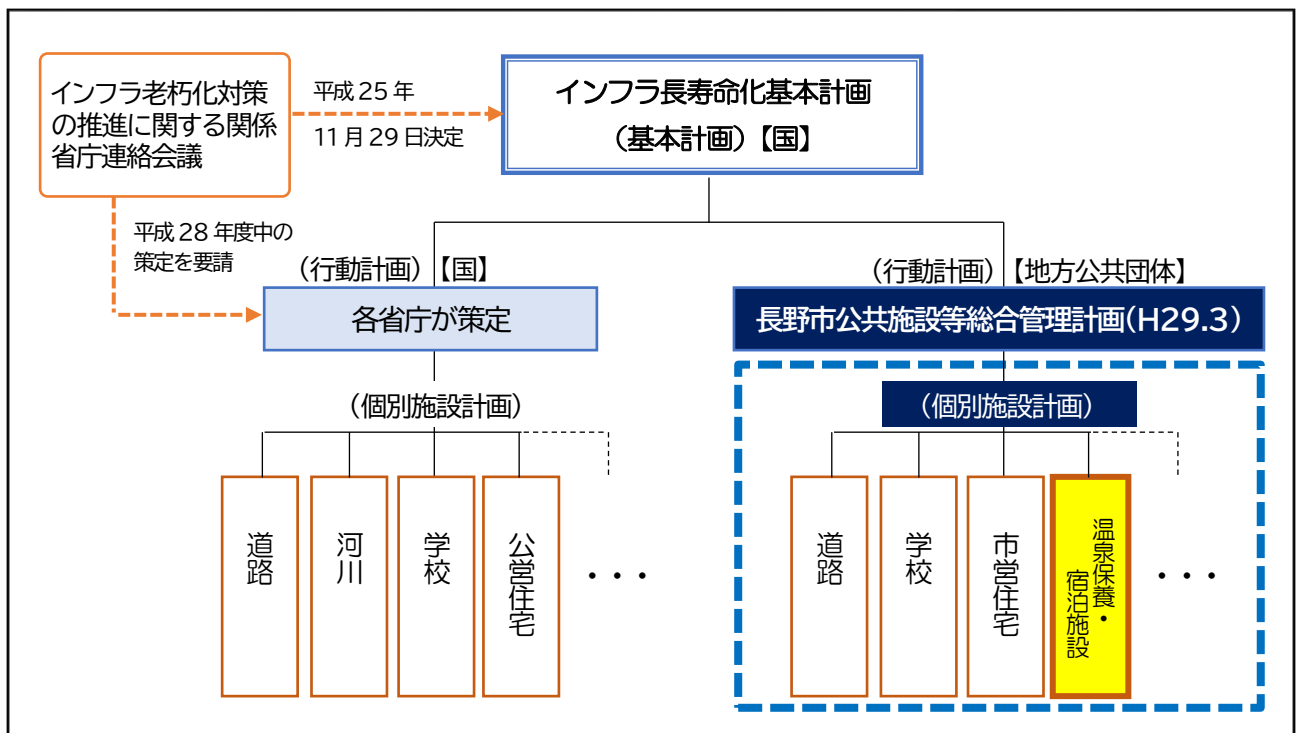

なお、過去に個別施設計画を策定した施設が本計画の対象である場合、本計画が当該施設の個別施設計画となります。

(2)計画の目的等

本計画は、保有施設の全体を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化等を計画的に推進することで、財政負担の軽減・平準化とともに、公共施設等の適切な保全と最適な配置の実現を目的とします。

この目的を実現していくため、普通財産を含めた施設を網羅し、目標使用年数までの残年数、改修周期、耐震性、借地料の有無等の個別施設の状況を示します(一部小規模な建物は除く。)

また、提供している機能(サービス)の方向性を検討し、老朽化等ハード面の課題に対する対策やその費用等を明らかにすることで、公共施設等適正管理推進事業債の活用要件を満たすものとしします。


(3)本市の現状と課題

ア 公共施設の老朽化

本市の公共施設は、高度経済成長期の急激な人口の増加に伴う行政需要の増大に対応するため、昭和 56 年(1981 年)頃をピークに、小中学校をはじめとする学校教育施設や市営住宅などの整備を積極的に行ってきました。

しかし、これらの施設は建築からすでに 30 年以上が経過しており、老朽化施設の割合は、47% (図1参照)に達しています。

また、平成 10 年(1998 年)に開催した長野冬季オリンピック・パラリンピックのために整備した、エムウェーブ(7.6 万㎡)をはじめとする大規模な競技施設が、長寿命化のための改修時期を迎えることもあり、改修・更新にかかる費用の財源確保が課題となっています。


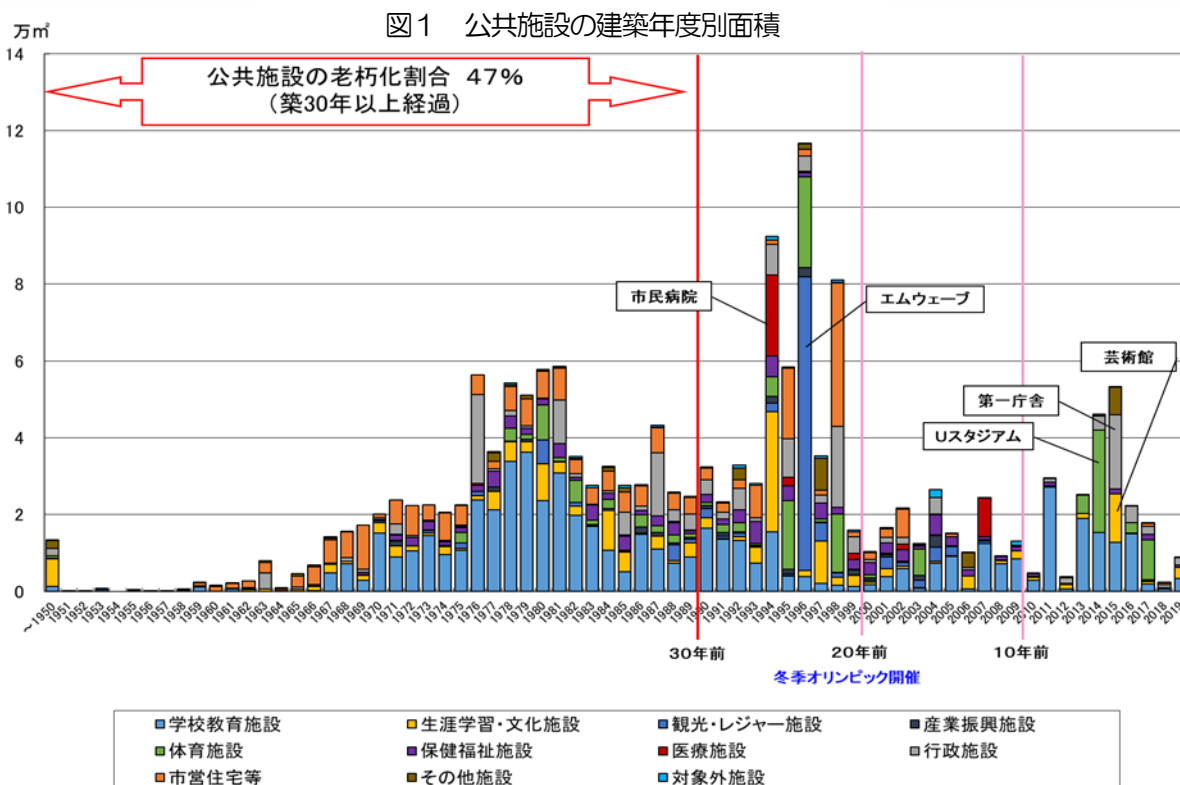


イ 人口減少、人口構成の変化

本市の総人口は、平成12年(2000年)にピークを迎え(図2参照)、今後も減り続けていく見込みです。また、人口構成は、より一層少子・高齢化の進行が見込まれており、社会保障関係費は増加する一方、生産年齢人口が減っていくため(図3参照)、公共施設の適正な維持管理の費用だけでなく、社会保障などの市民サービスにかかる費用をどう確保していくかが課題となっています。

年齢3区分別にみると、年少人口(0~14歳)は昭和55年(1980年)以降出生数が少なくなり、緩やかに減少しています。生産年齢人口(15~64歳)は平成7年(1995年)まで増加し、以降減少しています。老年人口(65歳以上)は、昭和40年(1965年)から増加傾向にあり、平成7年(1995年)には年少人口を上回りました。老年人口の増加は次第に緩やかになり、令和22年(2040年)以降は減少に転じると推計されています。

また、令和22年(2040年)には、現在より5万人以上の生産年齢人口の減少が見込まれ、人口構成も大きく変化することから、財政への影響が懸念され、行政需要の変化への対応を進める必要があります。

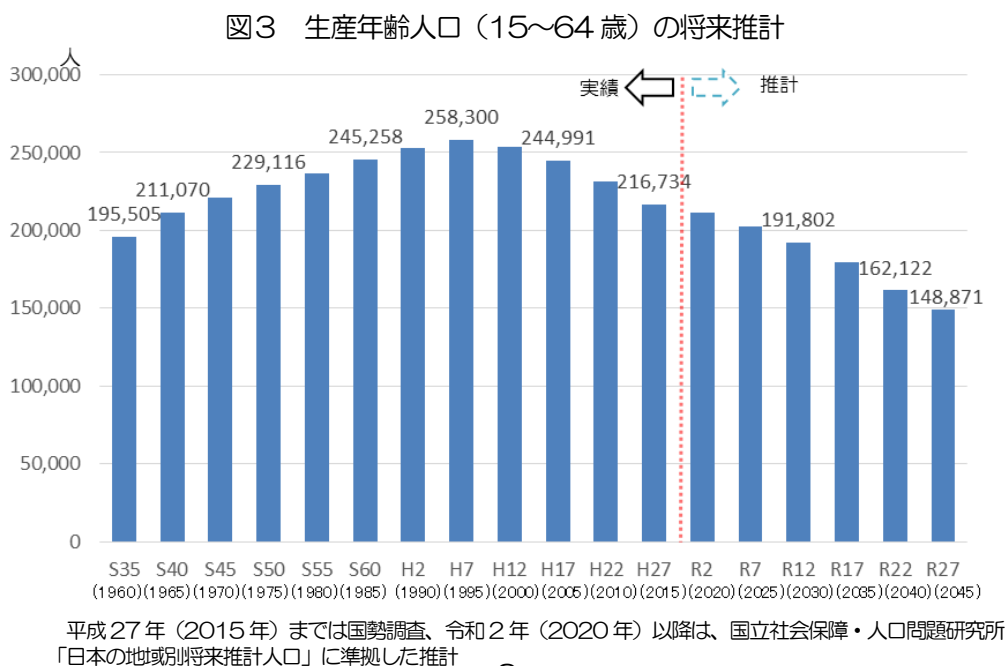
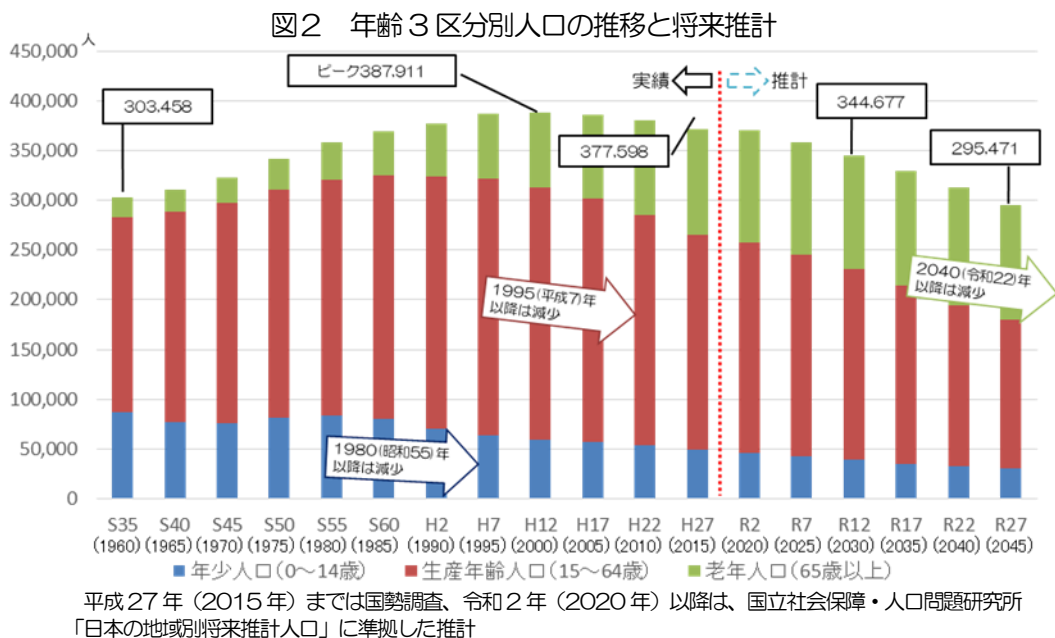


ウ 本市の財政状況

本市の歳出決算額の推移(図4参照)で平成12年度(2000年度)と平成30年度(2018年度)を比較すると、扶助費(社会保障関連経費)が約3倍に増えています。一方で、投資的経費は減少傾向にあります。市税収入は、平成19年度(2007年度)に、一旦は税源移譲により増加したものの、その後は横ばい傾向にあります。

令和元年東日本台風災害や新型コロナウイルス感染症の影響もあり、今後、本市の財政はさらに厳しくなることが予想されることから、今後の公共施設の適正な維持管理については、安全性を確保しながら最適なサービスを提供し続けていけるかが課題となります。

こうしたことから、現在保有しているすべての施設を残す(建て替える)ことは不可能(図5参照)な状況にあります。

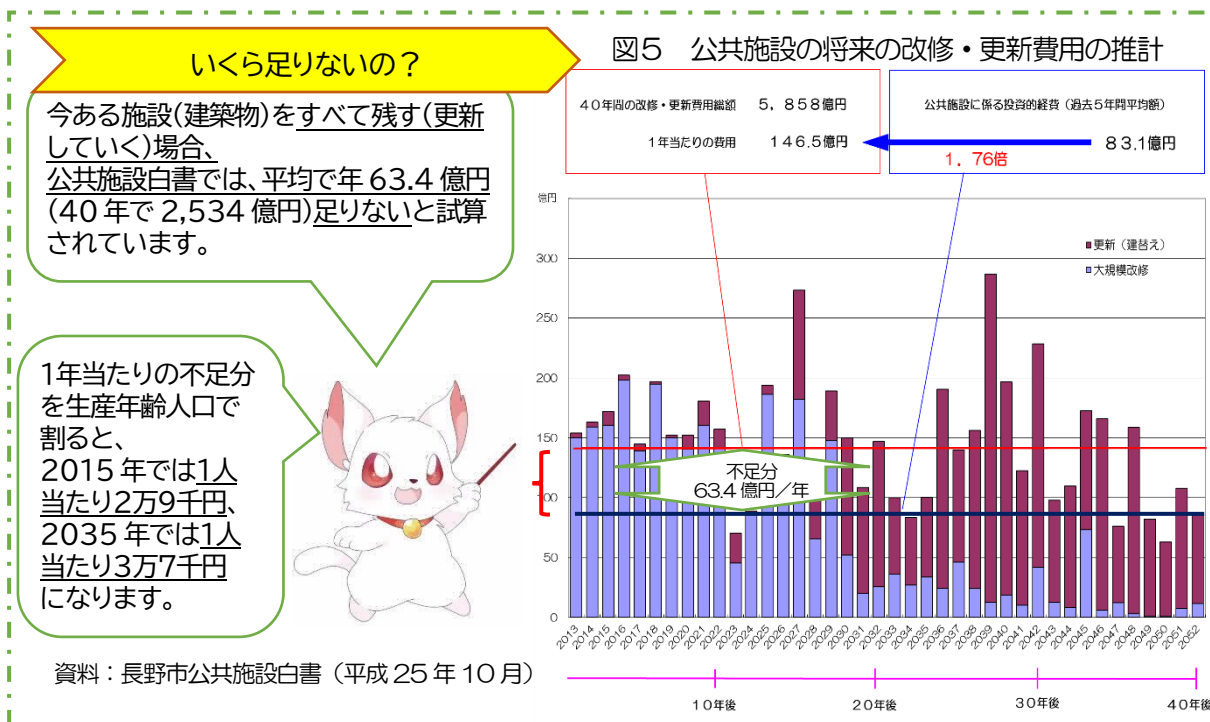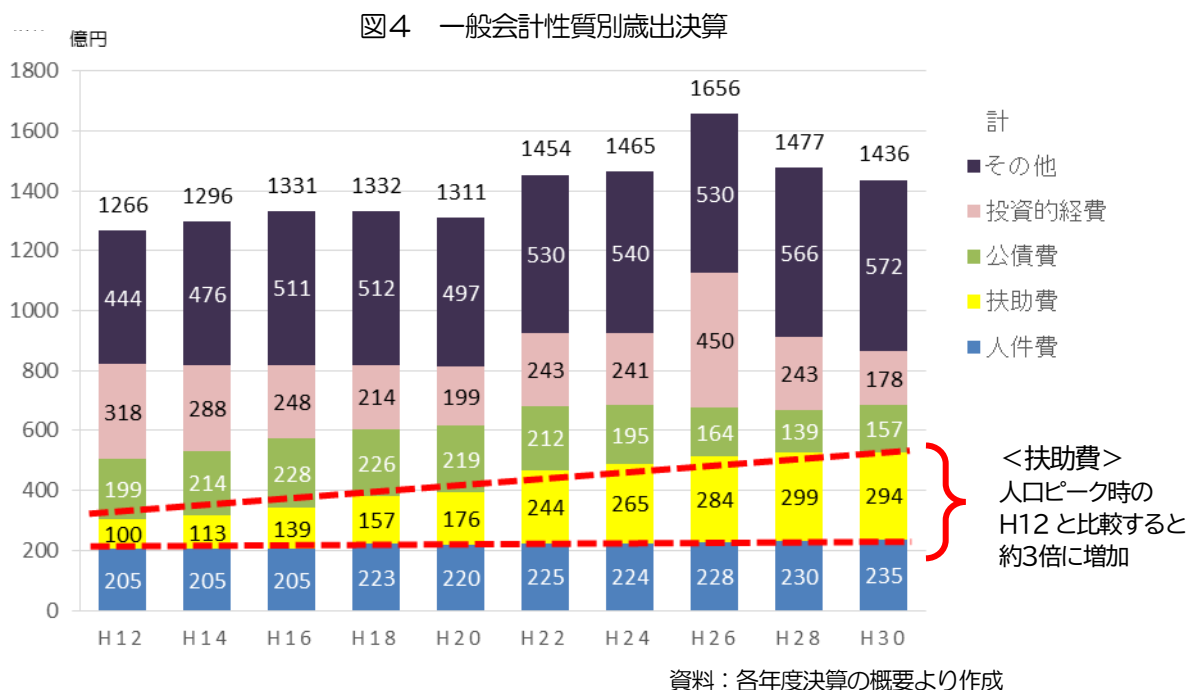

2 対象施設

(1)対策等を示す施設

次ページの表の見方

1	施設名称		設置条例等		所管課	地区	面積	構造	建築年度	
	①		②		③	④	⑤	⑥	⑦	
経過年数	目標使用残年数	耐震基準	耐震性	指定管理	複合施設	借地	指定避難所	期間中に改修・更新を迎える年度	改修・更新の内容	特記事項
⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱

⑥「構造」～⑪「耐震性」の各欄と⑯「期間中に更新・改修を迎える年度」、⑰「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。

①施設名称
名称(原則は、条例等による)を表示

②設置条例等
設置根拠を表示

③所管課
施設所管課名を表示

④地区
所在している地区名(市内32地区名)を表示

⑤面積
建物延床面積(複数棟は合計面積)を表示

⑥構造
面積が最も大きい棟の構造を表示
W造(木造)、S造(鉄骨造)、RC造(鉄筋コンクリート造)、SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)、LGS造(軽量鉄骨造)、その他

⑦建築年度
面積が最も大きい棟の建築年度を表示

⑧経過年数
建築年度から令和3年度中に迎える経過年数を表示

⑨目標使用残年数
各施設の目標使用年数(原則、新耐震の非木造80年、旧耐震の非木造50年、木造40年)に対する残数を表示

⑩耐震基準
昭和56年以前に建てられた建物は、「旧」、昭和56年の新耐震基準以降に建てられた建物は、「新」を表示

⑪耐震性
耐震性があるものに「○」、ない又は不明なものは「-」を表示

⑫指定管理
指定管理制度を導入している施設は「○」を表示

⑬複合施設
複合施設は「○」を表示

⑭借地
借地の場合は、「有償」又は「無償」を表示

⑮指定避難所
指定避難所は「○」、指定避難場所を除く指定緊急避難場所は「場所」、指定なしは「-」を表示(令和2年3月31日現在)。なお、指定緊急避難場所は、当該施設(建築物)ではなくその敷地が指定されている場合も含む

⑯期間中(10年間)に更新・改修を迎える年度
⑰の時期を西暦で表示。ただし、過去に耐震改修や屋根塗装など長寿命化に相当する改修を行っている場合は、改修周期を先延ばししている

⑰改修・更新の内容
次の区分で⑯の内容を表示。なお、表示される数字、文字は次を意味する。
「20」は、200㎡以上の新耐震非木造及び木造の20年目の長寿命化改修(中規模改修)の時期
「40」は、新耐震非木造の40年目の長寿命化改修(大規模改修)の時期
「更新」は、旧耐震及び新耐震非木造200㎡未満の50年目(更新時期)、木造等の40年目(更新時期)
「経過」は、更新時期が計画期間前に経過


⑱特記事項
複合施設の相手方施設名及び、施設が立地する敷地が土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の場合は「R」を表示

表1 温泉保養・宿泊施設

「構造」～「耐震性」の各欄及び、「期間中に更新・改修を迎える年度」並びに「更新・改修の内容」欄は、各施設の最も大きい棟の内容を表示しています。

施設名称	設置条例等	所管課	地区	面積 (㎡)	構造	建築 年度	経過 年数	目標使用 残年数	耐震 基準	耐震性	指定 管理	複合 施設	借地	指定 避難所	期間中に改修・更新 を迎える年度	改修・更新 の内容	特記事項
1 アゼリア飯綱	-	観光振興課	芋井	6166.5	R C造	1980	41	9	旧	○	-	-	-	○	2030	更新	
2 松代荘	長野市国民宿舎松代荘の設置及び管理に関する条例	観光振興課	松代	3930.8	S造	1997	24	56	新	○	○	-	-	-	-	-	
3 湯湯温泉 湯～ぱれあ	長野市湯湯温泉利用施設の設置及び管理に関する条例	観光振興課	若穂	2376.9	S造	2005	16	64	新	○	○	-	-	-	2025	20	
4 保科温泉	長野市保科温泉の設置及び管理に関する条例	観光振興課	若穂	3529.9	S造	1994	27	53	新	○	○	○	-	-	-	-	若穂老人憩の家
5 豊野温泉りんごの湯	長野市豊野健康増進型コミュニティ施設豊野温泉りんごの湯の設置及び管理に関する条例	観光振興課	豊野	2632.2	S造	2004	17	63	新	○	○	-	-	-	2024	20	
6 森林囃子	長野市戸隠交流集会施設の設置及び管理に関する条例	観光振興課	戸隠	1024.9	R C造	1982	39	41	新	○	○	-	-	-	2022	40	
7 鬼無里の湯	長野市鬼無里地域資源活用総合交流促進施設鬼無里の湯の設置及び管理に関する条例	観光振興課	鬼無里	2168.8	S造	2003	18	62	新	○	○	-	有償	-	2023	20	R
8 鬼無里ふるさとの館	-	観光振興課	鬼無里	536.44	W造	1989	32	8	新	○	-	-	有償	-	2029	更新	
9 品沢高原管理棟	-	観光振興課	鬼無里	232.13	W造	1970	51	-11	旧	-	-	-	-	-	経過	経過	
10 品沢高原体育館	-	観光振興課	鬼無里	258	S造	1970	51	-1	旧	-	-	-	-	○	経過	経過	
11 大岡温泉	長野市大岡交流施設大岡温泉の設置及び管理に関する条例	観光振興課	大岡	340.88	W造	2001	20	20	新	○	○	-	有償	-	2021	20	
12 聖山パノラマホテル	長野市大岡観光施設の設置及び管理に関する条例	観光振興課	大岡	2039.6	W造	2001	20	20	新	○	○	-	-	-	2021	20	
13 信州新町萩野森の家	長野市信州新町萩野森の家の設置及び管理に関する条例	観光振興課	信州新町	405.88	W造	1991	30	10	新	○	-	-	有償	-	-	-	
14 信州新町信州犀川交流センター	長野市信州新町信州犀川交流センターの設置及び管理に関する条例	観光振興課	信州新町	1806.3	R C造	1975	46	4	旧	-	-	-	有償	○	2025	更新	
15 信州新町青少年旅行村	長野市信州新町青少年旅行村の設置及び管理に関する条例	観光振興課	信州新町	424.56	W造	1975	46	-6	旧	-	○	-	有償	-	経過	経過	
16 不動温泉保養センターさざり荘	長野市不動温泉保養センターさざり荘の設置及び管理に関する条例	観光振興課	信州新町	2400	W造	1973	48	-8	旧	-	○	-	-	-	経過	経過	
17 中条地域振興施設やきもち家	長野市中条地域振興施設やきもち家の設置及び管理に関する条例	観光振興課	中条	1360.8	S造	2004	17	63	新	○	○	-	-	○	2026	20	R

(2)施設の配置

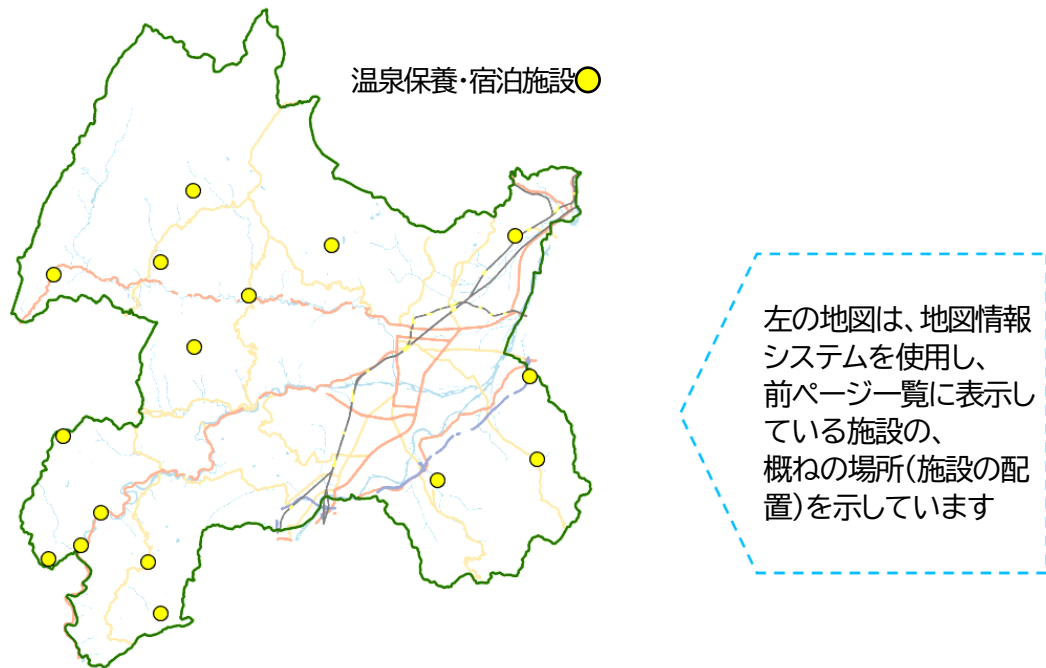

3 計画期間

本計画の期間は、令和3年度(2021年度)から令和12年度(2030年度)までの10年間とします。計画期間中は、進捗状況等についてフォローアップを実施し、把握した状況を踏まえ、5年を目安に見直すこととします。

なお、見直しの時期については、社会情勢の変化、地域の人口構成やニーズ等の変化、取組の進捗状況等に応じ、柔軟に行い、継続的に公共施設マネジメントを推進します。

4 施設の現状と課題

(1)設置目的


市民及び観光客の保養と健康増進を図り、もって利用者の福祉の向上と地域の活性化に資することを目的としています。

(2)根拠法令等

- ・長野市国民宿舎松代荘の設置及び管理に関する条例
- ・長野市温湯温泉利用施設の設置及び管理に関する条例
- ・長野市保科温泉の設置及び管理に関する条例
- ・長野市豊野健康増進型コミュニティ施設豊野温泉りんごの湯の設置及び管理に関する条例
- ・長野市戸隠交流集会施設の設置及び管理に関する条例
- ・長野市鬼無里地域資源活用総合交流促進施設鬼無里の湯の設置及び管理に関する条例
- ・長野市大岡交流施設大岡温泉の設置及び管理に関する条例
- ・長野市大岡観光施設の設置及び管理に関する条例
- ・長野市信州新町萩野森の家の設置及び管理に関する条例
- ・長野市信州新町信州犀川交流センターの設置及び管理に関する条例
- ・長野市信州新町青少年旅行村の設置及び管理に関する条例
- ・長野市不動温泉保養センターさざり荘の設置及び管理に関する条例
- ・長野市中条地域振興施設やきもち家の設置及び管理に関する条例

(3)老朽化の状況

施設の4割近くが築30年を経過し、今後、複数の施設で建て替え時期を迎えることになり、その更新費用は膨大です。更新に当たっては、利用状況等を踏まえた施設の在り方の検討が必要となります。

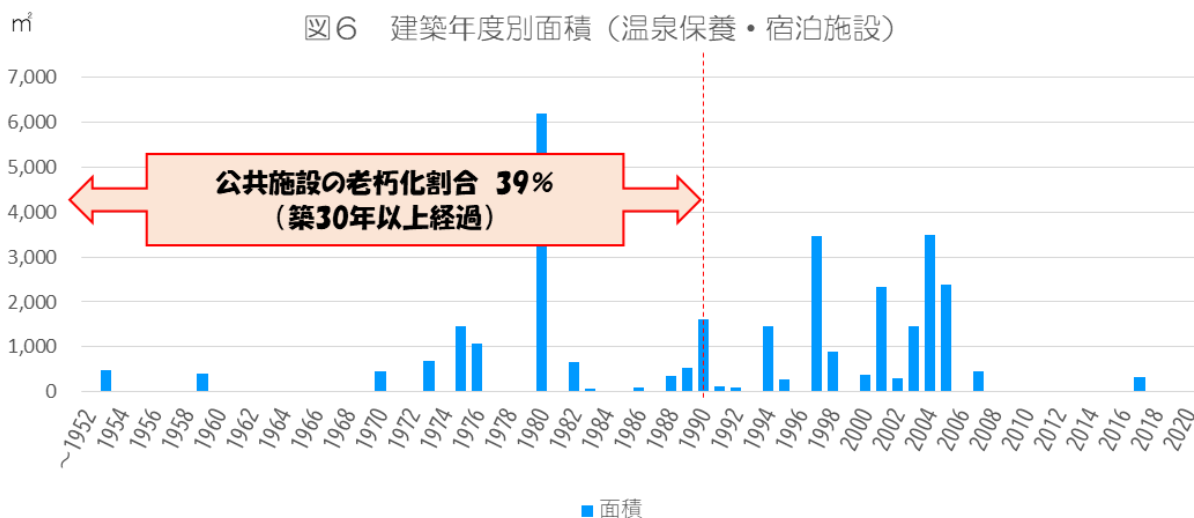


(4)利用状況

利用者数は、全体的にやや減少傾向にあり、施設により大きな開きが見られます。
 今後は、人口減少に伴い、中山間地域の施設を中心に更なる利用者の減少が想定されます。

図7 利用状況（温泉保養・宿泊施設：利用者数）

詳細は巻末資料参照

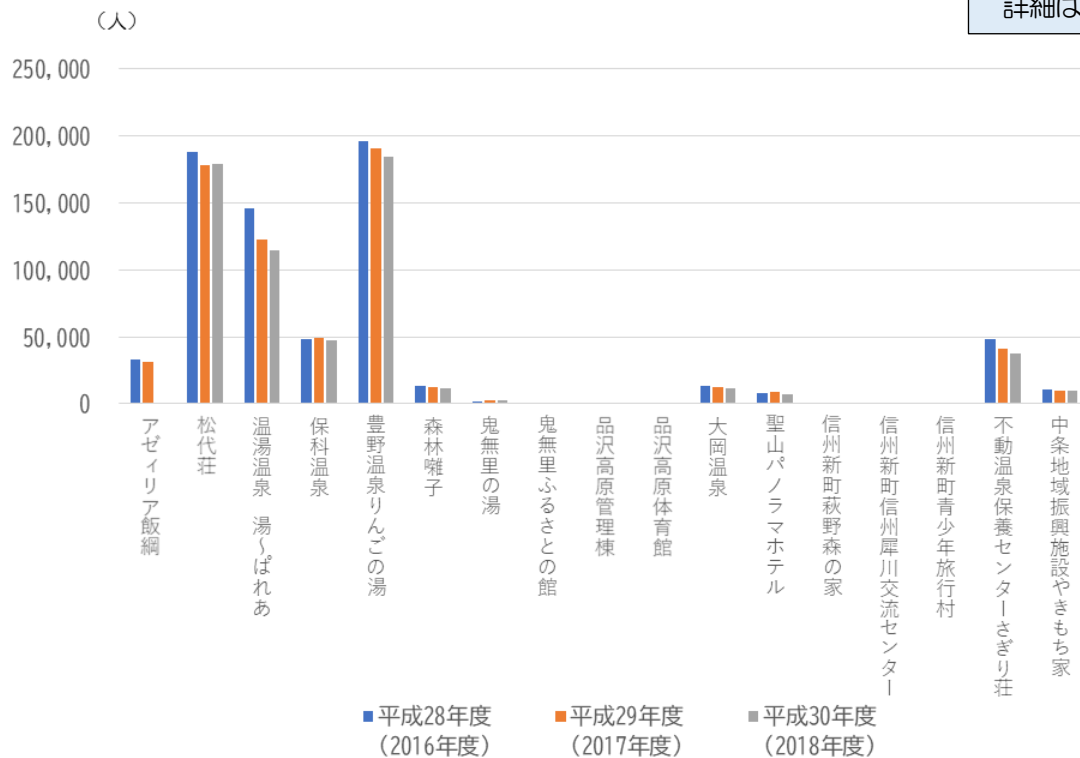

(5)維持管理コストの状況

本計画では、管理運営経費(ランニングコスト ※1)として以下の科目を集計しています。

区分	科目	内容
支出	人件費	施設職員の人件費（同一基準による積算）
	光熱水費	電気、ガス、水道等の料金
	修繕費 ※2	施設（設備）の修繕料
	委託料	設備点検、清掃、警備等の委託料
	賃借料	土地や建物に係る賃借料
	指定管理料	指定管理者施設の管理運営コスト
収入	使用料等	施設の使用料や手数料等の歳入

※2 大規模な改修工事費を除いている場合があります。


※1 インシヤルコストとランニングコスト

公共施設の整備等に当たっては、建設費等のインシヤルコストだけでなく、ライフサイクルコスト=LCCを含めた検討が必要です。

LCCは建物の建築から廃止・解体まで生涯にわたってかかるコストであり、建設に係るコスト以上に維持管理等のコストがかかります。


[3, 000 m²の官庁庁舎、65年間のコストを算定した場合]

企画設計コスト	1.6%	設計・現地調査・環境管理
建設コスト	25.7%	工事管理・建設・施工検査
運用管理コスト	71.1%	保全・修繕・運用・一般管理
解体再利用コスト	1.6%	解体・再利用

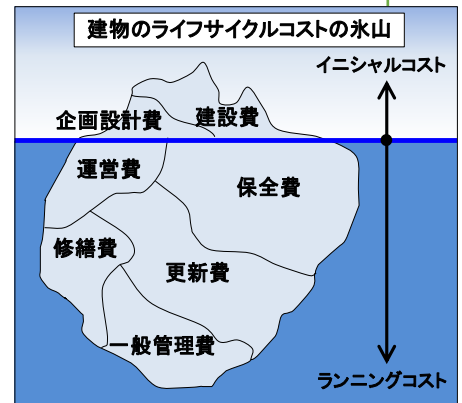

出典:国土交通省監修「建築物のライフサイクルコスト」

図8 コスト状況 (温泉保養・宿泊施設)

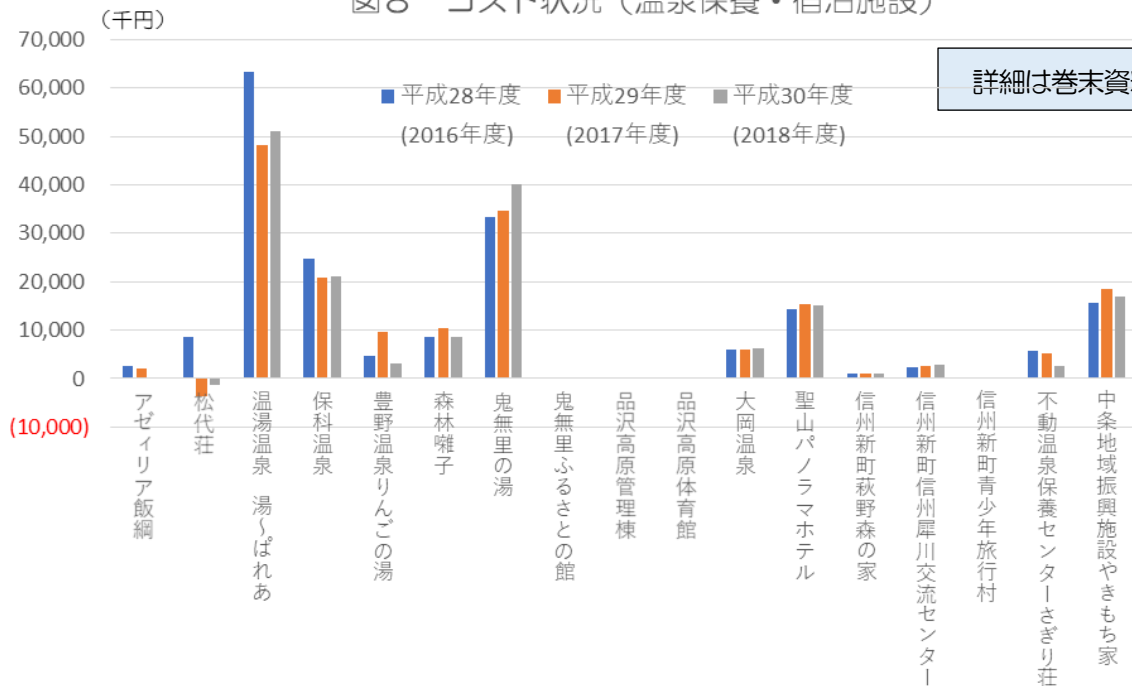

(6)今後の改修・更新費用の推計

推計は、公共施設白書※3に準じて、全ての建物について大規模改修を建設後 30 年で行い、その後 30 年(築 60 年)で今と同じ面積で建替えると仮定して試算しています。(「自然体」による推計)

※3 詳細は公共施設白書 47 ページからの「第4章 将来の改修・更新費用の推計」を参照

施設をすべて更新した場合の費用推計は次のとおりとなります。

表2 今後40年間の累計コスト一覧


期 間	改修(累計)	更新(累計)	合計(累計)
今後10年間	39.1億円	4.8億円	43.9億円
今後20年間	59.9億円	38.8億円	98.7億円
今後30年間	60.6億円	50.8億円	111.4億円
今後40年間	63.3億円	75.2億円	138.5億円

注)端数処理の関係で合計が一致しない場合があります。

温泉保養・宿泊施設の改修・更新費用は、今後40年間で改修費用が63.3億円、更新費用が75.2億円の合計138.5億円となります。

今後30年間で大きく増加することが見込まれるため、計画的な改修や長寿命化により経費を平準化することが必要となります。

図9 自然体による今後40年間の改修・更新費用推計

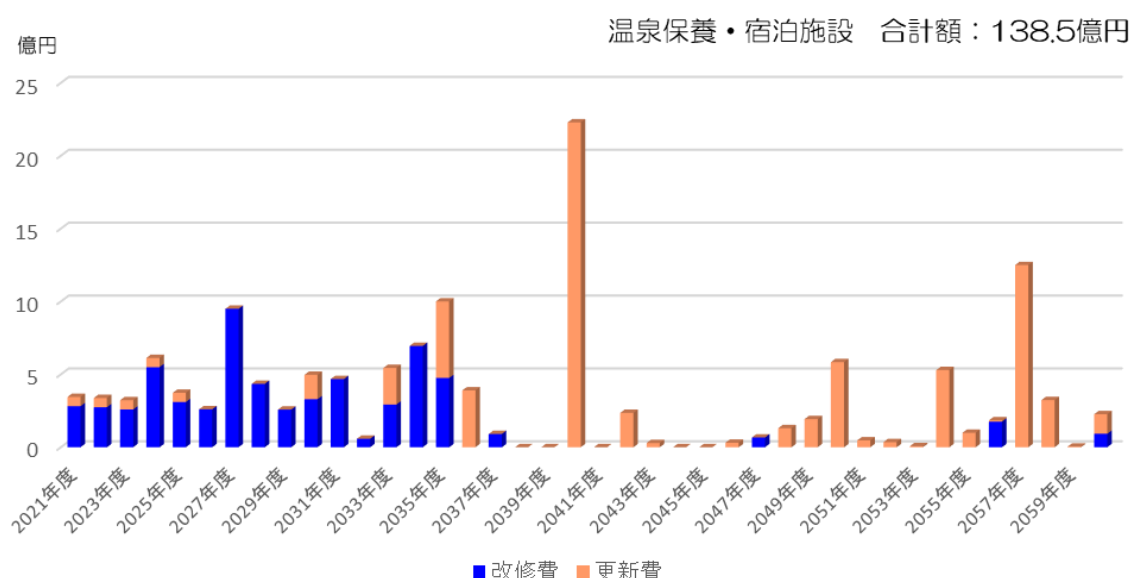

(7)これまでの施設配置や規模の基準等

施設の配置や規模について明確な基準等はなく、各設置条例等により決めています。

(8)課題

老朽化の進んだ施設が多数あり、今後の改修や更新費用が多額であり大きな課題となっています。利用者数も年々減少傾向にあり、市民負担の増大も課題となっています。また、利用率の高い施設と低い施設との開きが大きく、民間施設を含め機能(サービス)が類似した施設も市内に多数存在しており、官民の役割なども含め、施設の在り方を見直す必要があります。

5 施設評価(対策の優先順位の考え方)

総合管理計画では、施設の長寿命化と施設総量縮減(今後20年間で20%の延床面積の縮減※4)を合わせて進めることにより、改修・更新費用の縮減を図るものとしています。

※4 平成27年度(2015年度)に公共施設マネジメント指針を策定し、20年後の令和17年度(2035年度)までに公共施設総量(総延床面積)を20%縮減する目標を掲げています。

個別施設の方針を検討するに当たり、「長野市総合計画」をはじめ、「長野市都市計画マスタープラン」などの関連する計画を踏まえるとともに、施設の現状と課題の分析及び評価、地域特性や将来の人口減少による影響、社会的役割の変化等、様々な視点から総合的に検討します。

個別施設計画は、単なる削減計画ではなく、厳しい財政状況の中、必要な投資を確実に実施するための対応方針を定める計画です。
本市にとって、何が必要な投資なのかを十分に検討し、その必要な財源を確保するため、重点化や優先順位付けを行うことが重要です。

第五次長野市総合計画 (抜粋)

まちづくりの基本方針

2「持続可能な」まちづくりの推進

公共施設については、市民の理解を得ながら、既存施設の複合化・多機能化を進めるとともに、最適な維持・管理や計画的な改修等により長寿命化を図るなど、有効に活用しながらサービスを提供し、将来世代が安心して暮らし続けられるよう見直しを進めます。


長野市都市計画マスタープラン (抜粋)

都市づくりの目標

2 都市の資産を上手に使い再生する

公共施設の複合化・多機能化と、交通利便性の高い拠点エリアへの集約を戦略的に進めることで、様々な都市のストックを活用し、まちの再生を図る。

■ 対策の優先順位を検討するプロセスイメージ

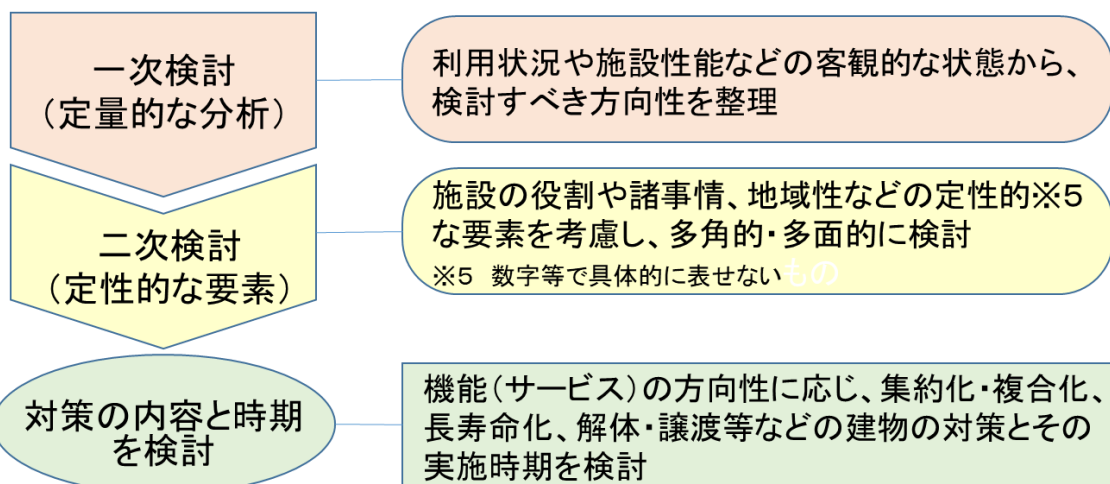

(1)一次検討(定量的な分析)

ア 建物の状態(劣化度)

経過年数に応じた評価、点検・診断結果を踏まえて評価します。

老朽化が著しく進んでいる場合は、安全確保が図られるよう早急に方針を決定し、対策を実施する必要があります。また、点検・診断は建築基準法に基づく12条点検又は施設管理者による部位部材の状態の日常点検による評価です。


経過年数 (カッコ内は新耐震※6)	評価A	点検・診断	評価B
⑤ 10年未満 (15年未満)	5	81～100点	5
④ 10年以上 (15年以上)	4	61～80点	4
③ 20年以上 (30年以上)	3	41～60点	3
② 30年以上 (45年以上)	2	21～40点	2
① 40年以上 (60年以上)	1	0～20点	1

※6 新耐震は昭和56年(1981年)6月に施行された基準を満たす建築物の場合

なお、土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に立地する施設の場合は、経過年数評価、点検・診断評価の結果にかかわらず最も低い評価としています。

イ 利用状況

利用者数や稼働率、件数等の利用状況により利用度を施設分類ごとに相対的に評価します。利用者が少ない施設や稼働率が低い施設については、サービスの必要性や提供方法の見直しによる改善が必要となります。



ウ 維持管理等コストの状況

維持管理コストを「イ 利用状況」と同様に施設分類ごとに相対的に評価します。

維持管理費が他の施設と比較して大きい施設については、サービスの内容や提供方法等を見直し、経費節減を図る必要があります。また、更新等に多額の費用を要する施設については、将来負担を踏まえた慎重な検討が必要です。

一次検討結果 (次頁)の見方

注)施設名称は、都合により8文字までの表記としています。


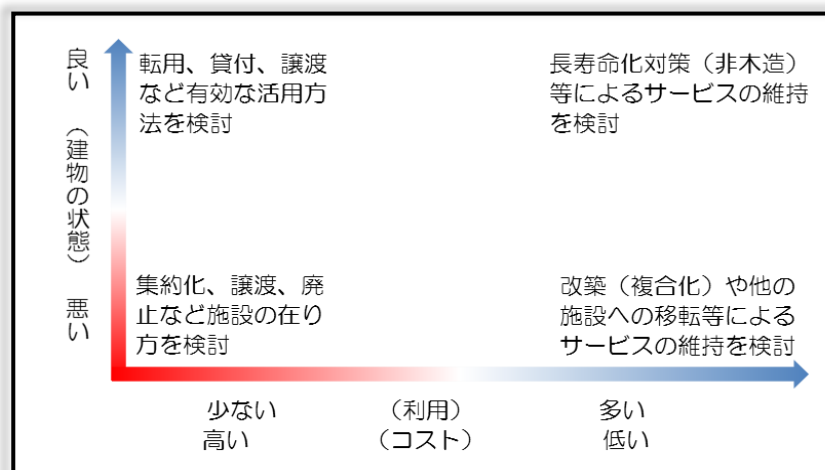


図 10 一次検討の結果

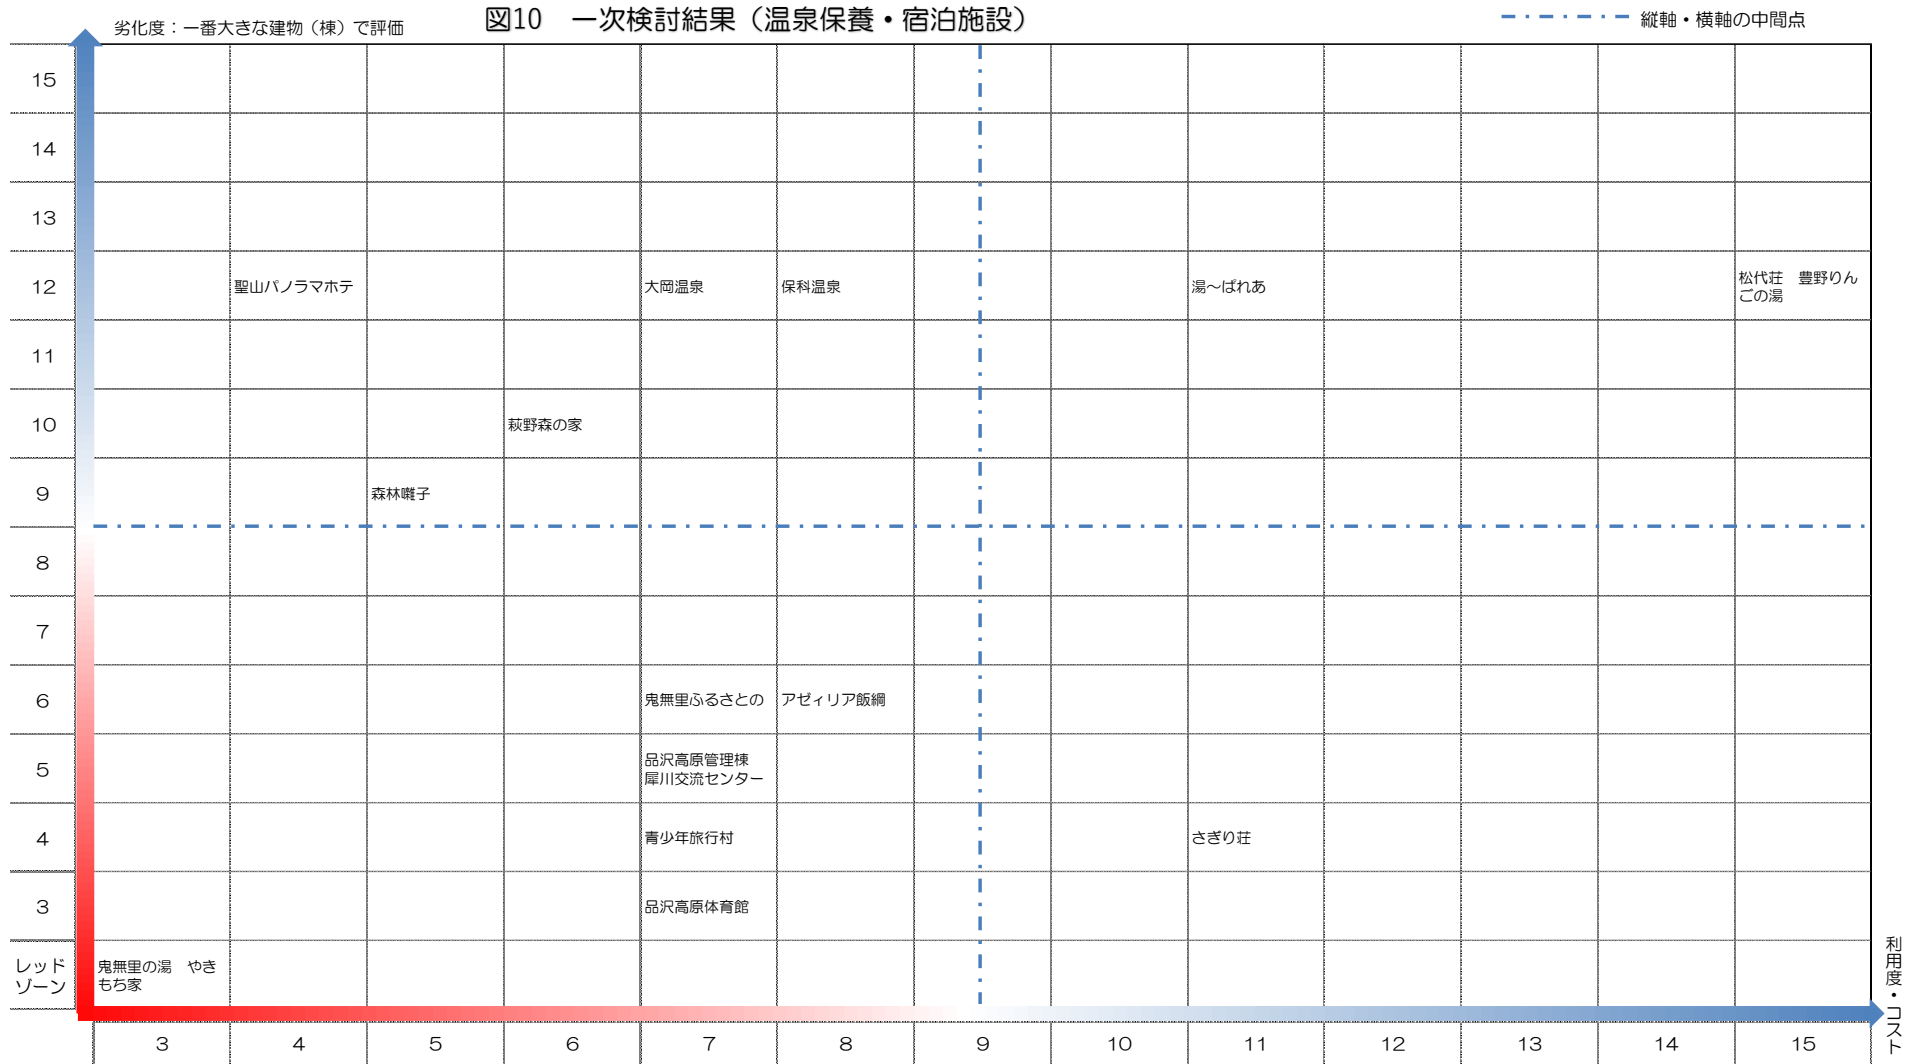

(2)二次検討(定性的な要素)

一次評価や、施設の現状と課題を踏まえ、地元の意見や施設利用者だけでなく、利用していない人や他地区の市民の目線など、多角的、多面的に検討します。

また、基本理念の「将来世代に負担を先送りすることなく、より良い資産を次世代に引き継いでいく」ため、将来の財政状況や改修・更新費用の推計を踏まえ、限りある財源を有効に使えるよう本市の公共施設全体で調整を行い、個別施設の方針を決定します。

ア サービスの必要性、代替性

提供しているサービスの必要性については、行政が実施しなければならないサービスであるか、今後の人口減少等により需要がどのように変化していくかを見極める必要があります。

また、他の類似の公共施設や民間施設でも実施していないか、民間や地域で実施できないか、施設(ハード)設置ではなくサービス(ソフト)で対応できないかという点も考慮する必要があります。

イ 施設配置状況等

本市は、合併により広い市域を持ち、地理的条件や地域の特色があり、同じ施設分類であっても施設規模に違いがあります。また、他の中核市(令和2年4月1日現在:長野市を含め60市)と比べて、施設数や延床面積が多ければ、財政力が中核市平均以下である本市にとっては、負担が大きいのになります。

ウ 運営の改善等

市が提供する様々なサービスに要する費用は、税金によって賄われており、市民全体で負担しています。しかし、特定の人だけが利用するようなサービスの場合、そのサービスを利用しない市民の税金も投入されており、利用する人と利用しない人の負担に差が生じることになります。

検討に当たっては、延床面積を単に縮減するのではなく、「行政サービスの利用者の負担に関する基準」を踏まえ、利用者に適正な受益者負担を求めることや、管理・運営の改善による本市の負担軽減によって施設を維持していくことも検討する必要があります。

エ ワークショップ・地元意見等

公共施設見直しの計画策定前の段階から、市民と市と一緒に検討する、地域の公共施設に関する試みとして、平成28年度にモデル地区として実施した芋井地区を皮切りに平成29年度から約3年かけて市内の全地区(長沼地区を除く)において、市民ワークショップや懇談会等を開催してきました。

本計画における対策等については、ワークショップ、利用者(受益者)、地元地区からの意見も参考にしつつ、利用していない人を含め、広く市民の意見を踏まえて検討します。

オ 対策による影響・効果

延床面積を単に縮減するのではなく、複合化や集約化による影響や効果、新しい価値観や機能の充実を含めて検討します。

例えば、複合化には、利用者が同じ場所に集まることによる賑わいや新たな交流の創出、ワンストップサービスなどの効果が期待できます。また、集約化では、廃止される施設の利用者にとっては施設への距離が遠くなるデメリットがありますが、集約化後の施設の賑わいや、節減された経費の一部を魅力向上への投資やソフト事業に回すことで、市民サービスの向上を図ることができます。

(3)二次検討の結果

ア サービスの必要性、代替性

温泉保養施設は、市民の保養及び健康増進ならびに交流の場を提供し、福祉の向上及び地域の活性化を図るものですが、市内には、民間の公衆浴場や温泉施設等などがあり、民間での代替性が高いサービスです。老人憩の家や老人福祉施設としての機能を持つ施設もありますが、サービスとしては民営化の検討が必要となっています。

宿泊施設は、都市の相互交流促進、自然と文化を生かした多面的な利用と地産地消の場として、多くは中山間地域にあります。市内には、民間の温泉・宿泊施設等などがあるため、民間でのサービスや運営を検討する必要がありますが、利用者は減少傾向となっており、収支の改善が課題です。

なお、アゼイリア飯綱は、令和2年度から、貸付により民営化を図っています。

鬼無里ふるさとの館は、平成26年の神代断層地震による被災施設であり、令和元年度に条例を廃止しました。鬼無里地区で施設の利活用について、地元への払下げ要望もありましたが、地元での維持管理が難しく断念し、建物の民間売却に向け公売を行いましたが無応募がありませんでした。

また、品沢高原管理棟及び、品沢高原体育館は、老朽化等により平成26年度に用途廃止しています。

イ 施設配置状況等

現在、市が営業している施設は、日帰り入浴のみの施設が5施設、宿泊可能な施設が7施設あります。多くが中山間地域に立地しており、冬季の利用が低迷するなど、稼働率が低い施設があります。信州新町地区には、複数の宿泊施設があり、整理が必要です。

ウ 運営の改善等

営業中のほとんどの施設は、指定管理者制度を導入しています。このうち、国民宿舎松代荘、りんごの湯、不動温泉保養センターさぎり荘は、利用料金等で運営費を賄っており指定管理料は生じていませんが、その他の施設では指定管理料が発生しています。

利用料金で運営している施設においても、修繕費や施設整備費などのコストが発生しており、利用料の改訂や利用者増など収支改善が課題となっています。

エ ワークショップ・地元意見等

【森林囃子】

地区別ワークショップで、施設の機能(情報発信、交流、食文化(食堂)継承の場、直売所等)を充実させるといった意見や介護予防等の機能を加えた新たな拠点や情報発信、交流、宿泊の拠点とするという意見がありました。

【鬼無里の湯】

指定管理者からは、老朽化した灯油ボイラー、大型マイクロバスの計画的な更新の要望があります。

【聖山パノラマホテル】

地区別ワークショップでは、聖山一帯(パノラマホテル、マレットゴルフ場、オートキャンプ場)は働ける場所として確保し、人を呼び込むきっかけにしたいという意見がありました。

【信州新町犀川交流センター】

地区別ワークショップでは、宿泊機能をさぎり荘に移転するという意見がありました。

【信州新町青少年旅行村・萩野森の家】

地区別ワークショップでは、2施設を集約化という意見や、2施設をさぎり荘に集約化して廃止するという意見がありました。

【中条地域振興施設やきもち家】

地区別ワークショップでは、やきもち家をPR拠点として人を呼び込みたい、道の駅などと連携しおやきに山姥の焼き印をつけるなどイメージアップを図るという提案がありました。

オ 対策による影響・効果

【国民宿舎松代荘】

保健保養訓練センターを廃止して老人憩の家に転用し、解体した旧老人憩の家の敷地も活用してより集客力の高い施設としてリニューアルすることで、施設総量を減少させながら利用者増を図ります。

【りんごの湯・湯～ぱれあ】

類似の民間施設と比べて廉価であり、入浴料を改訂して収益の改善を図ります。

民間主体でも提供可能なサービスのため、民間(指定管理者)への譲渡等を進めることにより、民間の創意工夫を生かし地域の実情に合った管理運営ができるようになり、指定管理料等の負担が軽減されます。

【保科温泉】

老人憩の家と併設しているため、民営化に当たっては施設の管理運営形態など注意する必要があります。

【森林離子・鬼無里の湯・大岡温泉・聖山パノラマホテル・やきもち家】

民間主体でも提供可能なサービスのため、民間(指定管理者)への譲渡等を進めることにより、民間の創意工夫を生かし地域の実情に合った管理運営ができるようになり、指定管理料等の負担が軽減されます。収支が改善されなければ、事業が継続できない可能性があります。

【信州新町犀川交流センター・信州新町青少年旅行村・萩野森の家・不動温泉保養センターさぎり荘】

借地料等の運営費負担が軽減されるとともに、地区内の宿泊機能が集約されることで、さぎり荘の利用者増につながることを期待されます。

6 個別施設の方針

総合管理計画では、施設総量縮減の施策(公共施設マネジメント指針で定めた令和 17 年度(2035 年度)までに公共施設総量(総延床面積)を 20%縮減する目標)や施設の長寿命化等の施策を合わせて進めることにより、改修・更新費用の縮減を図るものとしています。

【総合管理計画 基本方針】

- ① 施設総量の縮減と適正配置の実現 <目標 20 年で20%削減>
- ② 計画的な保全による長寿命化の推進 <新耐震・非木造 目標使用年数 80 年>
- ③ 効果的・効率的な管理運営と資産活用
- ④ 全庁的な公共施設マネジメントの推進

個別施設の方針は、その施設で提供している機能(サービス)を将来的に継続していくのかなどの機能の方向性と、その機能の方向性に応じて建物を建て替えるのか、改修するのかなどの建物の対策により示します。

(1)機能の方向性

提供している機能(サービス)の今後の方向性を、次のように区分します。

区分	機能の方向性
継続	計画期間中(10年間)は機能(サービス)を継続
民営化	計画期間中(10年間)に機能(サービス)を民間に移行(機能の実施主体を変更)
廃止	計画期間中(10年間)に機能(サービス)を廃止
要検討	現時点において、上記の対策を示せないもの

(2)建物の対策

機能の方向性、建物の状態などに応じて、建物の対策を、次のように区分します。

区分	建物の対策
集約化・複合化	集約化又は複合化するため建替え又は改修
長寿命化 ※7	耐用年数を超える目標使用年数(原則、新耐震非木造施設は80年、木造施設(LGS造等含む)は40年)まで使用するための長寿命化のための改修工事を実施
単独改築	集約化・複合化できない場合に単独で建替え(現在の複合施設の建替えを含む)
事後保全	建替えや長寿命化のための改修工事等は行わず、補修等を行いながら当面、維持
民間譲渡等	民営化のため民間事業者等に建物を譲渡、貸付
転用 ※7	機能廃止後の建物を改修し、他の用途(機能)で使用
解体・譲渡等	機能廃止後の建物を解体、譲渡又は貸付

※7 「長寿命化」「転用」の施設の長寿命化のための改修工事


本計画における対策が「長寿命化」「転用」の施設は、総合管理計画の長寿命化基本方針に基づき、目標使用年数までの間、竣工後 20 年、30 年、40 年、60 年を目標に『長寿命化のための改修工事』を次のように実施します。

《建築物を目標使用年数まで活用するために不可欠な改修事業》

工事時期の目安 (建築後の経過年数)	主な工事内容等
20年	屋根塗装、屋上防水、外壁塗装、コンクリートのひび割れ対策・凍害対策、シーリング打替え、タイル補修、自火報・蓄電装置・空調・ポンプ等の設備更新の他、機器の生産終了に対応した改修
30年	受変電設備・昇降機更新
40年	コンクリートの中性化対策、鉄筋又は鉄骨の防錆対策、屋根塗装又は葺替え、屋上防水、外壁塗装、シーリング打替え、タイル補修、トイレ改修、大規模な仮設建物を設けない程度の内装改修・電気設備更新・機械設備更新の他、バリアフリー化やニーズの変化に応じた改修
60年	20年+30年の工事

ただし、オリンピック施設等の大規模施設は、上記の周期で長寿命化のための改修工事を行うと、対象年度での工事費が巨額となり、財政への影響が大きいため、必要な工事を5年ごとに実施するなど平準化を図りながら施設を長寿命化し、目標使用年数までの活用を目指します。

■ 機能の方向性と建物の対策の関係及びイメージ

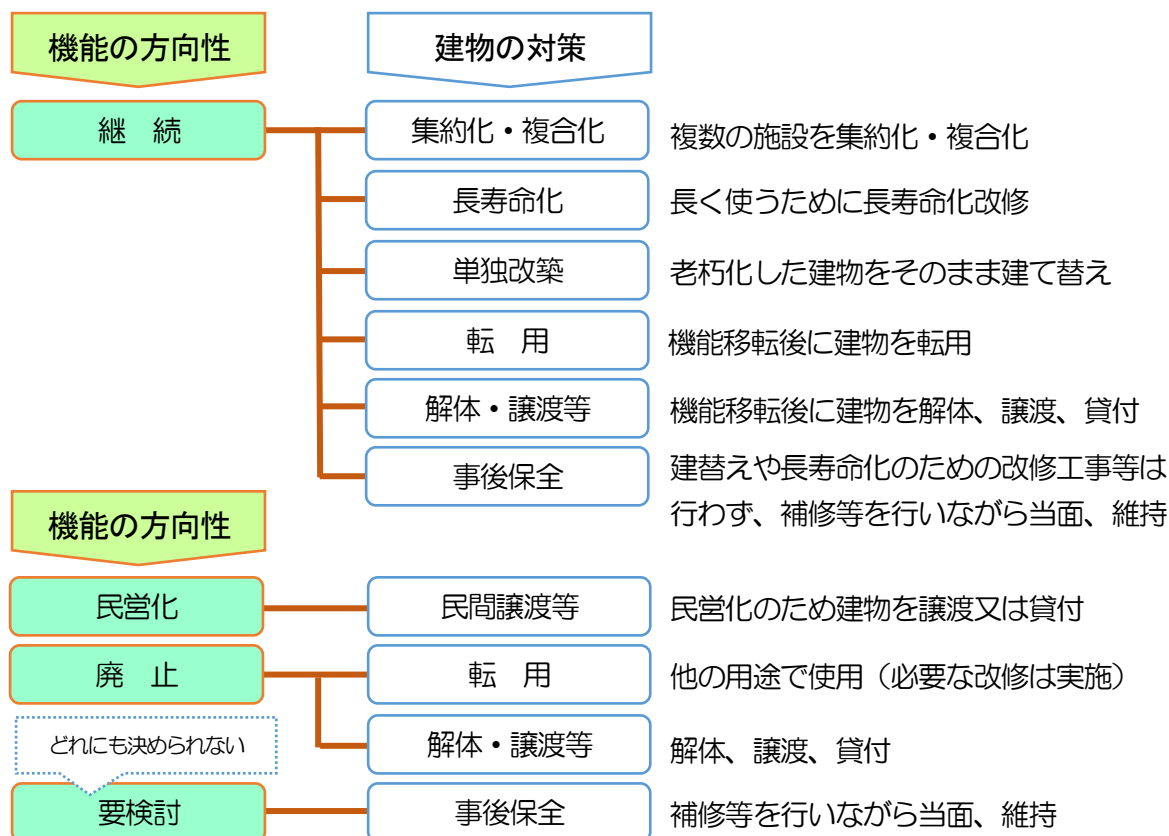



ア 機能＝「継続」

建物区分	内容
集約化・複合化	<p>①2以上の施設を更新時に複合化</p> <p>例)支所と公民館の複合化 例)2以上の体育館を集約化</p> <p>AとBが同じ分類(色)の場合は集約化となります。</p>
	<p>②A施設の一部を改修して他の用途を加え、複合施設とする。 なお、B施設の対策は解体・譲渡等、転用又は民間譲渡等となる。</p> <p>例)学校の空教室を改修し、福祉施設と複合化</p>
長寿命化	<p>耐用年数を超える目標使用年数まで使用するため改修</p> <p>新耐震非木造施設は原則80年</p>
単独改築	<p>同じ施設をそのままの内容で建て替え(複合化できない場合)</p> <p>現在の複合施設をそのまま建て替える場合も含む</p>


イ 機能＝Bが「継続」、Aが「廃止」の組み合わせ (転用の例)

建物区分	内容
<p>Aは転用 Bは解体・譲渡等</p> <p>Aの機能は「廃止」</p> <p>古い施設は解体、譲渡</p> <p>事例)旧フルネットセンターを公文書館に転用</p>	<p>用途廃止した施設を改修して用途変更</p> <p>用途変更のための改修</p> <p>Bの機能は「継続」</p>



ウ 機能＝「継続」又は「要検討」

建物区分	内容	
事後保全	大規模改修等を行わず、事後保全により維持管理を継続	あまりお金をかけずに維持 
		

エ 機能＝「民営化」

建物区分	内容	
民間譲渡等	民間にサービスを引き継ぐ 例) 保育所の民営化	民間が運営継続
		

オ 機能＝「廃止」

建物区分	内容	
解体・譲渡等	有償、無償による譲渡(売却益は基金へ)	民間による利用
		
	廃止後の施設を解体	
		

(3)実施時期

ア 対策を実施する時期について、次の各区分に「○」を、実施時期が期間外の場合は、期間内欄に「期間外」を表示します。

区分	概要
前期	計画期前半(令和3(2021)～令和7(2025)年度)に実施予定の場合
後期	計画期後半(令和8(2026)～令和12(2030)年度)に実施予定の場合
期間内	前・後半は未定だが、計画期間中(10年間)に実施予定の場合

イ 空欄とする場合

区分	概要
事後保全	特段の対策(改修等)がないため空欄

(4)個別施設の方針(10年間の対策等)

対象となる施設の今後の方針は、次のとおりです。

No.	施設名	地区	機能の方向性	建物の対策	実施時期		
					前期	後期	期間内
1	アゼイリア飯綱	芋井	民営化	民間譲渡等	○		
	民間への貸付を行う。						
2	松代荘	松代	継続	長寿命化	○		
	平成30～令和2年度にかけて大規模改修事業を実施し、今後も利用者増を図る取組を行いつつ、予防保全工事を行う。						
3	温湯温泉 湯～ばれあ	若穂	民営化	民間譲渡等			○
	民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。						
4	保科温泉	若穂	民営化	民間譲渡等			○
	収支改善を図り、運営費の赤字解消に取り組むとともに、民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い、民間譲渡等を検討する。						
5	豊野温泉りんごの湯	豊野	民営化	民間譲渡等			○
	収支改善を図り、運営費の赤字解消に取り組むとともに、民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。						
6	森林囃子	戸隠	民営化	民間譲渡等			○
	収支改善を図り、運営費の赤字解消に取り組むとともに、民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。						
7	鬼無里の湯	鬼無里	民営化	民間譲渡等		○	
	収支改善を図り、運営費の赤字解消に取り組むとともに、民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。						
8	鬼無里ふるさとの館	鬼無里	廃止	解体・譲渡等	○		
	令和元年度に条例を廃止し、建物の売却について公募したが、応募が無いため解体する。						
9	品沢高原管理棟	鬼無里	廃止	解体・譲渡等	○		
	平成26年度に条例を廃止しており、建物は老朽化が著しいため解体する。						
10	品沢高原体育館	鬼無里	廃止	解体・譲渡等			○
	平成26年度に条例を廃止しており、建物は避難所の指定解除ができる場合は解体する。						
11	大岡温泉	大岡	民営化	民間譲渡等		○	
	収支改善を図り、運営費の赤字解消に取り組むとともに、民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。						
12	聖山パノラマホテル	大岡	民営化	民間譲渡等		○	
	収支改善を図り、運営費の赤字解消に取り組むとともに、民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。						

No.	施設名	地区	機能の方向性	建物の対策	実施時期		
					前期	後期	期間内
13	信州新町萩野森の家	信州新町	廃止	解体・譲渡等	○		
	利用者が減少し、施設の老朽化が進んでいる上、借地であり売却等の利活用も困難であるため、用途を廃止し、解体等を検討する。						
14	信州新町信州犀川交流センター	信州新町	廃止	解体・譲渡等	○		
	利用者が減少し、施設の老朽化が進んでいる上、借地であり売却等の利活用も困難であるため、用途を廃止し、解体等を検討する。宿泊機能は、近隣のさざり荘に集約する。						
15	信州新町青少年旅行村	信州新町	廃止	解体・譲渡等	○		
	施設の老朽化が進み、休止中である上、借地であり売却等の利活用も困難であるため、用途を廃止し、解体等を検討する。						
16	不動温泉保養センターさざり荘	信州新町	民営化	民間譲渡等			○
	収支改善を図り、運営費の赤字解消に取り組むとともに、民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。						
17	中条地域振興施設やさもち家	中条	民営化	民間譲渡等			○
	収支改善を図り、運営費の赤字解消に取り組むとともに、民間主体で提供可能なサービスのため、施設管理を適正に行い民間譲渡等を検討する。						

7 個別施設の対策等に係る費用

(1)概算費用

6の(4)個別施設の方針(10年間の対策等)で示した方針に係る計画期間中の改修、更新、解体費用の試算額は、次のとおりです。

表3 対策に要する概算費用

建物の対策	前半	後半	10年間
集約化・複合化	0.0億円	0.0億円	0.0億円
長寿命化	6.4億円	0.0億円	6.4億円
単独改築	0.0億円	0.0億円	0.0億円
事後保全	0.0億円	0.0億円	0.0億円
民間譲渡等	0.0億円	0.0億円	0.0億円
転用	0.0億円	0.0億円	0.0億円
解体・譲渡等	1.1億円	0.0億円	1.1億円
計	7.4億円	0.0億円	7.5億円

注)端数処理の関係で合計が一致しない場合があります。

(2)対策の効果

施設の解体や民間譲渡を進めることにより、将来的な改修費や更新費が削減されます。また、長寿命化改修により施設を長く使用することで、長期的には改修・更新経費の低減が見込まれます。

6の(4)で示した対策を実施した場合の今後10年間の改修・更新経費の推計及び、4の(6)で試算した、当該施設を耐用年数経過時に単純更新した場合の(自然体の)経費見込みとの比較は次のとおりです。

表4 対策の効果

対策前		対策後		効果	
面積(m ²)	改修・更新経費	面積(m ²)	改修・更新経費	面積(m ²)	改修・更新経費
31,634.59	43.9億円	3,930.83	7.5億円	27,703.76	36.4億円

今後10年間で、施設総量は27,703.76 m²縮減(建物の対策を「民間譲渡等」、「解体・譲渡等」としたものの)、改修・更新経費は36.4億円の削減効果が見込まれます。(推計方法は次頁参照)

【対策に要する概算費用の推計方法】

① 改修・更新時期の基本的考え方

木造(LGS造含む)		ア: 築20年目に改修し、築40年で更新	
非木造	旧耐震	イ: 改修せず、築50年で更新	
	新耐震	200㎡未満	ウ: 改修せず、築50年で更新
		200㎡以上	エ: 20年毎に改修し、目標使用年数80年で更新
受変電設備及びエレベータ		オ: 30年毎に改修	

② 建物の対策別の積算経費の内容

建物の対策	対策に要する経費
集約化・複合化	更新費+解体費
長寿命化	改修費
単独改築	更新費+解体費
事後保全	なし
民間譲渡等	なし
転用	改修費
解体・譲渡等	解体費

③ 金額の算定方法

改修費、更新費、解体費ともに㎡単価×面積により算出する。

受変電設備及びエレベータ改修は、1基当たりの改修費を想定する。

【単価表】

(単位: 千円)

【1基当たり改修費】 (単位: 千円)

構造	棟用途	20年目	40年目	60年目	更新	解体	種別	改修費
非木造	事務所(その他)	42	166	42	400	30	受変電設備	15,000
	集合住宅	19	147	19	280	20	エレベータ (11人乗り以下)	20,000
木造	事務所(その他)	42	/	/	400	30	エレベータ (12人乗り以上)	30,000
	集合住宅	19	/	/	280	20		

改修単価は、中長期保全計画(平成31年2月)において推計した中規模施設の改修費の平均単価

更新単価は、長野市公共施設白書における推計単価(財団法人自治総合センターの調査研究報告書による)

解体単価及び受変電設備・エレベータ改修費は、公共施設マネジメント推進課で想定

(各単価には、設計、監理、仮設建物、外構にかかる経費を含まない)

④ 計上年度の考え方

ア: 改修は、築20、40、60年目に計上。ただし、過去に当該改修相当の改修工事を行っている場合は、その実施年度から起算し先送り

イ: 更新は、①に示した各年度に計上。ただし、アと同様に先送り

ウ: 受変電設備、エレベータは、設置年度から30、60年目に計上

ア及びイにおいて、該当する年度が既に経過している積み残し分など、計上すべき年度と「対策の実施時期」が異なる場合は、「対策の実施時期」に応じて平準化して計上

⑤ 積算後の調整(大規模施設の中長期保全計画)

中長期保全計画において改修・更新経費を推計した大規模施設については、構造等が特殊であり、③で推計した改修・更新経費との乖離が大きいため、中長期保全計画の推計額に置き換える。

8 公共施設マネジメントの更なる推進に向けて

人口減少の進展、人口構造の変化、市民ニーズの多様化、令和元年東日本台風災害からの復旧・復興など、本市財政を取り巻く状況は一層厳しくなっていることから、本市が保有する公共施設については、施設総量の縮減目標を踏まえて、総合管理計画における4つの基本方針と取組の柱に基づく老朽化対策を、全庁的に進めていく必要があります。

一方、市民が日々利用している公共施設の統廃合等については、慎重な対応が求められることから、本計画の対策は、現時点で示すことのできる範囲となっています。

今後も検討が必要としている施設など、積み残している課題がある施設については、総合管理計画の方向性や、施設の現状と課題を踏まえ検討を続け、方針が定まったものから計画の見直しを行ってまいります。

本計画の推進に当たっては、施設ごとに利用率や老朽度、近隣の類似施設の有無などの状況を踏まえ、地域をはじめ関係者と十分に協議を重ねながら、柔軟かつ機動的に進め、実効性のあるマネジメントに取り組んでまいります。

なお、令和3年度には、本計画の対策等を反映して、インフラ施設を含む総合管理計画の改訂に取り組み、「将来世代に負担を先送りせず、より良い資産を次世代に引き継いでいく」公共施設マネジメントを推進してまいります。

<資料>

(1)利用状況一覧〔4 施設の現状と課題(4)利用状況 図7関係〕

No.	施設名	地区	利用区分	単位	平成28年度 (2016年度)	平成29年度 (2017年度)	平成30年度 (2018年度)	令和元年度 (2019年度)
1	アゼィリア飯綱	芋井	利用者数	人	33,098	31,027		28,698
2	松代荘	松代	利用者数	人	188,230	178,555	178,825	159,173
3	温湯温泉 湯～ぱれあ	若穂	利用者数	人	145,676	122,645	114,496	109,279
4	保科温泉	若穂	利用者数	人	48,458	49,206	47,413	45,636
5	豊野温泉りんごの湯	豊野	利用者数	人	195,911	190,375	184,019	142,280
6	森林囃子	戸隠	利用者数	人	13,426	12,484	11,275	6,907
7	鬼無里の湯	鬼無里	利用者数	人	2,068	2,192	2,856	2,605
8	鬼無里ふるさとの館	鬼無里	利用者数	人				
9	品沢高原管理棟	鬼無里	利用者数	人				
10	品沢高原体育館	鬼無里	利用者数	人				
11	大岡温泉	大岡	利用者数	人	13,400	12,508	11,739	10,592
12	聖山パノラマホテル	大岡	利用者数	人	7,608	8,434	6,611	6,818
13	信州新町萩野森の家	信州新町	利用者数	人	52	48	69	34
14	信州新町信州犀川交流センター	信州新町	利用者数	人	383	414	502	475
15	信州新町青少年旅行村	信州新町	利用者数	人				
16	不動温泉保養センターさぎり荘	信州新町	利用者数	人	48,264	41,115	37,061	38,315
17	中条地域振興施設やきもち家	中条	利用者数	人	10,825	9,628	9,554	7,538

(2)コスト一覧(単位:千円)[4 施設の現状と課題(5)維持管理コストの状況 図8関係]

No.	施設名	地区	平成28年度 (2016年度)	平成29年度 (2017年度)	平成30年度 (2018年度)	令和元年度 (2019年度)
1	アゼイリア飯綱	芋井	2,663	2,105	0	0
2	松代荘	松代	8,702	-3,587	-1,428	700
3	湯湯温泉 湯～ぱれあ	若穂	63,466	48,166	51,073	55,405
4	保科温泉	若穂	24,843	20,800	21,124	20,993
5	豊野温泉りんごの湯	豊野	4,814	9,572	3,006	12,518
6	森林囃子	戸隠	8,698	10,519	8,577	8,472
7	鬼無里の湯	鬼無里	33,265	34,546	40,140	37,764
8	鬼無里ふるさとの館	鬼無里	353	353	353	353
9	品沢高原管理棟	鬼無里	35	21	20	19
10	品沢高原体育館	鬼無里	0	0	0	0
11	大岡温泉	大岡	6,043	6,107	6,368	6,977
12	聖山パノラマホテル	大岡	14,255	15,485	15,170	14,449
13	信州新町萩野森の家	信州新町	1,049	1,033	1,013	892
14	信州新町信州犀川交流センター	信州新町	2,446	2,592	2,969	3,846
15	信州新町青少年旅行村	信州新町	0	0	0	0
16	不動温泉保養センターさざり荘	信州新町	5,776	5,135	2,654	9,980
17	中条地域振興施設やきもち家	中条	15,722	18,599	16,936	15,432

【本計画の対象となる施設所管課】

・商工観光部 観光振興課

【お問い合わせ先】

・総務部 公有財産活用局公共施設マネジメント推進課

電話 026-224-7592
